



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA MUNICIPAL RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2022



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

ABRAHAM CÁRDENAS ROMERO

ALCALDE



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DENOMINACION	PIM	EJECUCION	% PIM
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	193,703,655.00	84,103,346.00	43.42
ACTIVIDADES (GASTO CORRIENTE)	76,927,912.00	44,202,913.00	57.46
TOTALES	270,631,567.00	128,306,259.00	47.41

Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022

GESTION DE RECURSOS ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y SECTORES

DENOMINACION	PERIODOS				TOTAL
	2019	2020	2021	2022	
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	42,499,594	19,096,363	52,233,189	20,042,329	133,871,475
ACTIVIDADES - MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO Y RUTINARIO		21,445,210	13,316,917	3,808,629	38,570,756
TOTALES	42,499,594	40,541,573	65,550,106	23,850,958	172,442,231

Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022

EJECUCION DE INVERSIONES EN EL ULTIMO AÑO DE GESTION MUNICIPAL

DENOMINACION	EJECUCION DE INVERSIONES EN EL ULTIMO AÑO DE GESTION DE LAS ULTIMAS 3 GESTIONES ANTERIORES			
	AGOSTO-2022	DIC 2018	DIC 2014	DIC 2010
EJECUCION DEL GASTO - SOLO PROYECTOS	84,103,346	71,604,777	84,903,163	84,141,592

Fuente: Sif Operaciones en Línea - al 31-08-2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA MUNICIPAL



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el mas alto nivel técnico – administrativo de la Municipalidad, encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y a los servicios que se prestan a los vecinos, en función a los lineamientos de política municipal, en coordinación con Alcaldía y de acuerdo a las disposiciones emanadas de esta.





ORGANIGRAMA GM





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- Desde el 01 de enero del 2019, tengo la responsabilidad de asumir la Gerencia Municipal, conformándose un Equipo de trabajo solido integrado por profesionales moqueguanos casi en su totalidad, para el inicio de todas las actividades encaminadas a lograr nuestros objetivos previstos, este año 2022 estamos cumpliendo 03 años 09 meses al frente de este gran reto.
- Se sigue teniendo mucho cuidado en la evaluación de los perfiles de los funcionarios que ingresan a ocupar los cargos de confianza, con la finalidad de no cometer faltas que originen denuncias tanto para el Sr. Alcalde, funcionarios y profesional que acepta el cargo.
- Una de las principales dificultades que seguimos teniendo todo este tiempo son las denuncias por Reposiciones Judiciales de Trabajadores, con la consecuente denuncia al Alcalde, Gerente Municipal y Jefe de Personal, son reposiciones de servidores de gestiones anteriores.





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- A la fecha se viene ejecutando a través de los Proyectos de Inversión con un PIM aprobado al mes de Setiembre 2022 de S/. 194,556,475.00 de los cuales se han gastado S/. 88,119,981.00 lo que significa el 45% en su ejecución. Es necesario mencionar que la ejecución mensualizada en todo este año ha superado los 10 millones trabajo muy importante de todas la áreas inmersas en esta labor, lo que no solo genera trabajo para la población de Moquegua, sino también a los proveedores locales que se ven beneficiados con el trabajo que da la municipalidad.
- Se recalca que se concluyo las Obras de la gestión anterior cumpliendo cabalmente con su ejecución.
- Actualmente se viene ejecutando **27 obras** por administración directa, siempre considerando la mejora para nuestra ciudad y la población, no solo de la parte del Cercado también de los diferentes Centros Poblados y ahora por el nuevo distrito de San Antonio





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- Para el año 2022 se han tenido múltiples reuniones con los 04 Sindicatos de la Municipalidad Provincial, pudiéndose negociar lo que es permitido por Ley en forma satisfactoria para cada uno de ellos, actualmente se están haciendo todos los esfuerzos de acuerdo a la recaudación para cumplir con sus deudas.
- Las subastas realizadas en el año 2021 por mas de S/. 1,500,000.00, han permitido seguir concretando pagos pendientes de los trabajadores tanto sindicalizados como sentencias judiciales, reconocimiento de deudas, otros
- Como se indico años anteriores, no existía un parque automotor a fin de atender todas las necesidades de la institución, actualmente se ha reflatado y repotenciado diferentes Equipos Mecánicos y unidades móviles las cuales se están utilizando satisfactoriamente, mas ha detalle informará el Jefe de Unidad Operativa.





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- Se han generado mecanismos para incrementar los ingresos en la institución a través de las Amnistías Tributarias, así como también beneficio para el pago de las papeletas y las campañas de manera muy agresivas con la finalidad de obtener ingresos propios para poder afrontar pagos tantos de personal, bienes y servicios.
- Desde la creación de la Municipalidad Distrital de San Antonio, como gestión hemos asumido la conducción administrativa de dicha institución hasta las nuevas elecciones del año 2022.
- Se ha generado mas de 1800 puestos de trabajo para las diferentes obras, así como también se logro dar trabajo a mas de 1000 mujeres por el periodo de dos meses en este año 2022.





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- Se ha implementado y se ha actualizado el ROF de la institución. A la fecha se aprobó a través de Ordenanza Municipal, la actualización respectiva.
- Se realizan constantes reuniones con los funcionarios de las gerencias, subgerencia y jefes de área, con la finalidad de resolver problemática presentada.
- Se ha tomado las acciones administrativas respectivas a través de memorándum a las áreas correspondientes para que el personal bajo cualquier modalidad no supere el año de labores, lo cual origina dificultades presupuestales y financieros los cuales no se pueden cumplir y genera denuncias y reposiciones.





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- Hemos asumido de acuerdo a las posibilidades financieras innumerables deudas de años anteriores, deudas impagas por su magnitud, comprometidos por la gestión anterior lo cual nos ha generado malestar con los sindicatos de la institución algunas deudas ya se están atendiendo.
- Hemos tenido que asumir Embargos de parte de Sunat, Ministerio de Transportes, de los trabajadores, Essalud., sentencias judiciales, Etc. Lo cual complica el correcto funcionamiento de la gestión en la institución y no poder asumir convenientemente los pagos puntualmente tanto a trabajadores como proveedores, incluso compromisos con los Sindicatos de Trabajadores





AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES

- Se coordino estrechamente con funcionarios de Contraloría General de la Republica, Auditoria caso Superconcreto. Se viene implementando las medidas administrativas, civiles y penales.
- Se realiza el seguimiento a través del Comité de Inversiones durante todo el año con presencia del representante del Ministerio de Economía, para medir el gasto de los proyectos de inversión, evaluando posibles inconvenientes que no permitan el avance efectivo del gasto y tomando decisiones efectivas para su ejecución.
- Se esta realizando el seguimiento tanto a la Ejecución presupuestaria y financiera de la institución a través de un organismo auspiciado por el Banco Mundial-MOQUEGUA CRECE, para el fortalecimiento del comité de gestión de inversiones, el cual genera un acompañamiento importante para el avance económico.





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 2022

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	%
00.RECURSOS ORDINARIOS	7,379,618.00	12,451,460.00	6,089,773.00	48.91
07.FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10,197,454.00	11,034,928.00	6,380,260.00	57.82
08.IMPUESTOS MUNICIPALES	5,306,672.00	5,811,108.00	3,159,154.00	54.36
09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,686,791.00	34,391,415.00	20,125,206.00	58.52
13.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,284,928.00	579,836.00	4.72
18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120,384,954.00	172,386,257.00	88,723,559.00	51.47
19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	22,271,471.00	3,248,471.00	14.59
TOTALES	172,955,489.00	270,631,567.00	128,306,259.00	47.41

FUENTE: Consulta Amigable al 31.08.2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIONES EJERCICIO FISCAL 2022

RUBRO	PIA	PIM	VARIACION	%
00. RECURSOS ORDINARIOS	5,436,832.00	6,700,045.00	1,263,213.00	23.23
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	3,744,322.00	3,744,322.00	100.00
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,284,928.00	12,284,928.00	100.00
18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	88,531,060.00	148,702,889.00	60,171,829.00	67.97
19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	22,271,471.00	22,271,471.00	100.00
TOTALES	93,967,892.00	193,703,655.00	99,735,763.00	106.14

FUENTE: Consulta Amigable al 31.08.2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

RUBRO	PIM	EJECUCION	%
00. RECURSOS ORDINARIOS	6,700,045.00	4,639,437.00	69.24
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,744,322.00	1,658,543.00	44.29
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,284,928.00	579,836.00	4.72
18.CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	148,702,889.00	73,977,059.00	49.75
19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	22,271,471.00	3,248,471.00	14.59
TOTALES	193,703,655.00	84,103,346.00	43.42

Fuente: Consulta Amigable - al 31-08-2022

PROYECTOS POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MODALIDAD DE EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	% PIA	% PIM
POR ADMINISTRACION DIRECTA	91,297,401.00	169,213,052.00	77,174,466.94	84.53	45.61
POR CONTRATA	1,170,491.00	22,907,992.00	6,782,740.64	579.48	29.61
PROCOMPITE	1,500,000.00	1,582,611.00	146,137.29	9.74	9.23
TOTALES	93,967,892.00	193,703,655.00	84,103,344.87	89.50	43.42

Fuente: Siaf Operaciones en Línea - al 31-08-2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES – OPMI



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PRINCIPALES LOGROS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

- **Diagnóstico de Indicadores de Brechas:** Informe Técnico N° 006-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN.
- **Programación Multianual de Inversiones 2022-2024:** R.A.N° 092-2022-A/MPMN (24/02/2022)
- **Seguimiento a indicadores de brechas del PMI:** Programado para el último trimestre.
- **Registro de inversiones no previstas:** 39 registros durante el primer semestre del año 2022.
- **Consistencia de la Cartera de Inversiones del PMI:** Se realizara el 30 de setiembre y diciembre.
- **Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones:** Se presentaron oportunamente 08 informes.
- **Sesiones de Comité de Seguimiento a las Inversiones:** Se realizaron 09.
- **Evaluaciones Ex Post:** Durante el primer semestre del Año Fiscal 2022 se han realizado siete (07).
- **Consultas:** Se ha absuelto consultas realizadas por las UF, UEI, GIP, GDES, GSC, OSLO, las consultas que se han atendido hasta junio del 2022 suman alrededor de 700 (aproximadamente).



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES PMI 2022-2024



POR TIPO DE INVERSIÓN

TIPO DE INVERSIÓN	CANTIDAD	%	COSTO DE INVERSIÓN		PROGRAMACIÓN 2022		PROGRAMACIÓN 2023		PROGRAMACIÓN 2024	
			SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
PROYECTO DE INVERSIÓN	118	83.10%	1,004'057,007.60	95.26%	98'945,711.38	92.51%	69'187,672.18	95.82%	97'066,335.61	98.26%
INVERSIONES IOARR	24	16.90%	50'008,641.97	4.74%	8'008,030.56	7.49%	3'020,581.03	4.18%	1'720,273.20	1.74%
TOTAL	142	100	1'054,065,649.57	100	106'953,741.94	100	72'208,253.21	100	98'786,608.81	100

FUENTE: Módulo PMI – MEF al 31/08/2022





PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES PMI 2022-2024

POR TIPO DE FUNCIÓN

FUNCIÓN	CANTIDAD	%	COSTO DE INVERSIÓN		PROGRAMACIÓN 2022		PROGRAMACIÓN 2023		PROGRAMACIÓN 2024	
			S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
AGROPECUARIA	13	9.15%	65,670,687.21	6.23%	645,291.99	0.60%	450,001.00	0.62%	5,476,519.60	5.54%
AMBIENTE	9	6.34%	68,478,134.20	6.50%	2,520,568.43	2.36%	5,042,683.00	6.98%	5,773,905.00	5.84%
COMERCIO	2	1.41%	37,230,000.00	3.53%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CULTURA Y DEPORTE	18	12.68%	52,711,032.68	5.00%	5,535,138.11	5.18%	1,679,048.00	2.33%	7,822,949.19	7.92%
EDUCACIÓN	10	7.04%	62,974,883.36	5.97%	426,086.79	0.40%	5,150,000.00	7.13%	4,655,490.00	4.71%
ENERGÍA	1	0.70%	2,163,723.57	0.21%	350,000.00	0.33%	1,775,025.00	2.46%	0.00	0.00%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	8	5.63%	29,253,053.68	2.78%	5,446,986.67	5.09%	3,084,629.00	4.27%	2,097,609.00	2.12%
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8	5.63%	27,951,021.79	2.65%	9,203,328.83	8.60%	1,350,164.00	1.87%	4,137,556.14	4.19%
PROTECCIÓN SOCIAL	1	0.70%	872,802.40	0.08%	400,000.00	0.37%	436,997.40	0.61%	0.00	0.00%
SALUD Y SANEAMIENTO	1	0.70%	42,035,491.43	3.99%	12,443.99	0.01%	1.00	0.00%	1.00	0.00%
SANEAMIENTO	14	9.86%	236,793,876.61	22.46%	19,702,263.34	18.42%	3,452,860.70	4.78%	12,464,346.31	12.62%
TRANSPORTE	49	34.51%	387,566,048.17	36.77%	60,442,428.55	56.51%	46,815,018.82	64.83%	44,629,339.57	45.18%
TURISMO	4	2.82%	17,399,215.35	1.65%	121,013.00	0.11%	302,979.00	0.42%	4,793,757.00	4.85%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4	2.82%	22,965,679.12	2.18%	2,148,192.24	2.01%	2,668,846.29	3.70%	6,935,136.00	7.02%
TOTAL	142	100.00%	1,054,065,649.57	100.00%	106,953,741.94	100.00%	72,208,253.21	100.00%	98,786,608.81	100.00%

FUENTE: Módulo PMI – MEF al 31/08/2022





SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION



PRINCIPALES LOGROS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

- “Actualización y modificación del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas”.
- “Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas y Escala de Multas”.
- Revisión, evaluación y emisión de opinión favorable del CAP- Provisional de la MPMN, en concordancia a lo establecido en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-SERVIR-PE.
- Elaboración de Proyecto de Ordenanza Municipal del Reglamento para las Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados 2022 de la jurisdicción de la Provincia Mariscal Nieto – Moquegua.
- Ejecución y desarrollo de las actividades y fases del Presupuesto Participativo para el año 2023.



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

PRINCIPALES LOGROS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

- Convocatoria para el Proceso de Elecciones en los 10 Centros Poblados.
- Conformación de 10 Comité Electorales en cada uno de los 10 Centros Poblados.
- Acompañamiento y Asistencia técnica a los Comités Electorales en las etapas de presentación de Listas de Candidatos, Designación de Miembros de Mesa, publicación definitiva de Candidatos.
- Consolidación y Publicación de la Memoria Anual Gestión 2021.
- Aprobación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI 2022.
- Aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025.
- Elaboración y Publicación del Reporte de Seguimiento del POI al I Semestre.
- Formulación para la actualización del PEI 2022-2026.
- Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional al 2021.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PRINCIPALES LOGROS



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	LOGROS OBTENIDOS
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL CONSORCIO AGRICOLA MOQUEGUA SAC - CAMSAC	Damas de la Región Moquegua	Con la finalidad de que ambas instituciones puedan implementar su política de responsabilidad social, por lo que se a dado la oportunidad laboral a las damas que radican en la Provincia de Mariscal Nieto, para brindar bienestar y mejorar la calidad de vida, realizando las actividades de Cosecha de la producción de Arándanos, entre los meses de Agosto y setiembre se requerirá en un promedio de personal de 600 damas.
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ADMINISTRACION Y TURISMO – EGATUR	Región Moquegua	Con un esfuerzo conjunto y articulado se estará brindando capacitaciones en las especialidades de cocina peruana e internacional, pastelería y panificación , bar y mixología, para lo cual va a permitir fortalecer las capacidades de los participantes de la Región Moquegua.
EN ALIANZA ESTRATEGICA CON LA EMPRESA DSM CONSULTORES PARA EL DICTADO DE CHARLA VIRTUAL Saldio a favor del EXPORTADOR (IGV) Y DRAWBACK	Región Moquegua	Se ha realizado el apoyo conjunto para la realización de la charla virtual, con el fin de fortalecer capacidades a las personas y empresas, con una participación en promedio de 55 asistentes.
EN ALIANZA ESTRATEGICA CON EL PROGRAMA EMPREDO EN CASA - SPCC	Programas sociales, comedores populares, vaso de leche y personas con discapacidad integral del adulto	Se ha realizado el apoyo conjunto para la realización del taller elaboración de productos, como preparación de manjar, néctares y chocotejas, con una participación en promedio de 44 asistentes.
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - UNAM	Estudiantes y profesionales de la Región Moquegua	Se pretende contribuir a establecer programas conjuntos de cooperación científica, técnica, productiva y de infraestructura para coadyubar al logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones.



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL CONSORCIO AGRICOLA MOQUEGUA SAC - CAMSAC



CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ADMINISTRACION Y TURISMO – EGATUR



CHARLA VIRTUAL:

Saldo a favor del exportador (IGV) y Drawback

BENEFICIOS AL EXPORTADOR
Retorno, recupera la liquidez que tu empresa necesita

Fecha: 24 de junio | Hora: 05:00 pm
¡Inscríbete y participa!



Municipalidad Provincial MARISCAL NIETO Grupo México MINERÍA SouthernPerú

Emprende en casa

ELABORACIÓN DE SUB PRODUCTOS
Participa en nuestros talleres presenciales y aprende a preparar manjar, néctares y chocotejas



Para beneficiarias de Programas Sociales: Comedores Populares, Vaso de Leche; y Personas con Discapacidad.

INICIO: 10 DE MAYO | 3:30 PM



Dirigido a beneficiarios del Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM.

FECHA: 24 DE MAYO | HORA: 2 PM

CURSOS PRESENCIALES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



GERENCIA DE ADMINISTRACION

La Gerencia de Administración es el órgano encargado de dar apoyo a la gestión de las Unidades orgánicas de la Municipalidad, en cuanto a recursos económicos y financieros, personal y suministro logístico en concordancia a las disposiciones vigentes de los sistemas administrativos que la conforman.



Logros



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

- ✓ SE REALIZÓ PAGO A ESSALUD EN MÉRITO AL ACOGIMIENTO AL REFADENT EN LA MODALIDAD PAGO AL CONTADO DEL EXPEDIENTE COACTIVO N°21F20160801728, POR EL IMPORTE DE S/ 18,145.00 SOLES Y DE ESA MANERA SE SOLICITÓ EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR EN EL BANCO DE LA NACIÓN, RECUPERANDO ASÍ S/ 33,465.00 SOLES DE LA CUENTA CORRIENTE N°00-141-089870.
- ✓ SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SOA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DEL PERÍODO 2021, EN MÉRITO AL ACUERDO DE CONCEJO N°020-2022-MPMN DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2022.
- ✓ COMO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, SE HA REALIZADO EL PAGO A ACREEDORES DE DEUDAS JUDICIALES, VERIFICANDO LOS EXPEDIENTES DE LOS ACREEDORES.
- ✓ SE APROBÓ EL LISTADO DE PRIORIZACIÓN ANUAL.
- ✓ SE PROYECTÓ LA CALENDARIZACIÓN DE PAGOS.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



- ✓ SE REALIZA ACTOS RESOLUTIVOS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE PAGOS A LOS DIVERSOS PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS A TRABAJADORES POR BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS, VACACIONES NO GOZADAS, REINTEGROS, REMUNERACIONES, RETRIBUCIONES, QUE NO FUERON REMUNERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES).
- ✓ SE TIENE TAMBIÉN RESOLUCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN POR DELEGACIÓN DE FACULTADES, PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (ADICIONAL, REDUCCIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, MODIFICACIONES AL CONTRATO, ENTRE OTROS).
- ✓ RESOLUCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN POR FONDO POR ENCARGO, SOLICITADA POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVA.
- ✓ DEBEMOS RECALCAR TAMBIÉN, QUE, LOS REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOLICITADOS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y TRANSPARENCIA, FUERON Y VIENEN SIENDO ATENDIDOS CON LA DEBIDA CELERIDAD DE CADA CASO Y RESPETANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL N°27444.





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



PERSONAL CON QUE CUENTA LA MPMN

Personal permanente y funcionarios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto			
Personal nombrado	149	Empleados	83
		Obreros nombrados y contratados	58
Repuestos judiciales	113	Empleados	49
		Personal obrero	64
Funcionarios	49	Funcionarios D. Leg. No 276	08
		Funcionarios D. Leg. No 1057 – CAS	41





LOGROS EN LA PRESENTE GESTION

Que, la Entidad Municipal ha efectuado la contratación temporal de personas al 31 de Agosto del año 2022, se llevo a cabo la Selección de Personal (Técnico, Obrero) mediante Sorteo Publico, dándose oportunidad de trabajo a la población en general; llegando a la cifra total de 7 249 Puestos laborales entre Hombres y Mujeres; También se llevo a cabo el Programa denominado “Mujeres Trabajando”; Finalmente se dio oportunidad a los estudiantes Universitarios y/o Técnicos que realizaron sus Practicas, en las diferentes especialidades, lo que demuestra que esta gestión otorgó oportunidad laboral para todos.

TOTAL HOMBRES	6 625	TOTAL MUJERES	621	TOTAL	7 246
MUJERES TRABAJANDO	2 134	PRACTICANTES	169	TOTAL	2303





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022


1. Se presentó ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas en los plazos previstos por ley, los respectivos Estados Financieros mensuales, trimestrales, Semestrales.
2. Se realizaron las Conciliaciones de Operaciones Recíprocas y de las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgada con Entidades del Sector Público, presentándose las Actas de conciliación ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y en los plazos previstos por ley.
3. Se firmaron Actas de conciliación de las cuentas del Activo y Pasivo correspondiente al I Trimestre y I Semestre del ejercicio 2022.
4. Se cumplió con la presentación IGV ante la SUNAT, según cronograma establecido.





LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

5. Se desarrolló las operaciones de Registro de las Fases Compromiso, Devengado, de los hechos financieros y presupuestarios generados por la Gestión Municipal vigente en el Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF, trasmitiendo en línea vía internet, las respectivas solicitudes de autorizaciones.
6. La Municipalidad ha iniciado las acciones del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable según lo establecido en el art. 3.3 del Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria, aprobado mediante RD 001-2022-EF/51.01.
7. Se gestionó la adquisición de licencias de software de gestión de Información Financiera y Presupuestaria (CLARISSA y MELISSA), para los diferentes usuarios de la institución, contribuyendo a una mejor toma de decisiones y en tiempos óptimos.





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE TESORERIA



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

RESUMEN DE INGRESO Y GASTO MENSUALIZADO



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR - (09) CUT

Banco	Cta.Cte.	Mes	LBan	Debe LB Ingreso	Haber LB Gasto	SALDO
4		RECAUDACION DE LAS CAJAS				
		RDR - (09)				
		0	APERTURA	1,173,117.41		
		1	ENERO	515,011.23	404,976.32	1,283,152.32
		2	FEBRERO	541,690.05	593,925.87	1,230,916.50
		3	MARZO	772,017.42	757,849.17	1,245,084.75
		4	ABRIL	626,945.98	1,062,925.41	809,105.32
		5	MAYO	637,402.98	938,436.21	508,072.09
		6	JUNIO	487,518.26	631,491.44	364,098.91
		7	JULIO	506,427.70	842,437.59	28,089.02
		8	AGOSTO	561,677.98	570,874.45	18,892.55
TOTAL				5,821,809.01	5,802,916.46	18,892.55





RESUMEN DE INGRESO Y GASTO MENSUALIZADO

OIM - (08) CUT

Banco Cta.Cte. Mes L Ban				Debe LB Ingreso	Haber LB Gasto	Contador
	RECAUDACION DE LAS CAJAS			3,590,457.88	2,933,319.11	
		OIM - (08)		3,590,457.88	2,933,319.11	
	0	APERTURA		316,150.76		
	1	ENERO		173,952.04	180,714.68	309,388.12
	2	FEBRERO		264,206.21	459,677.36	113,916.97
	3	MARZO		675,362.37	478,723.28	310,556.06
	4	ABRIL		738,821.38	362,563.99	686,813.45
	5	MAYO		354,993.76	292,349.83	749,457.38
	6	JUNIO		467,038.36	365,779.31	850,716.43
	7	JULIO		359,946.92	362,379.95	848,283.40
	8	AGOSTO		239,986.08	431,130.71	657,138.77
T O T A L				3,590,457.88	2,933,319.11	657,138.77



REPORTE DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE ENERO - ABRIL 2022

BANCO		TRANSFERENCIAS ENERO A ABRIL 2022	GASTOS ENERO A ABRIL 2022
BANCO DE LA NACION -			IMPORTE
FTE FTO	18 - CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACION		
T.R.	DESCRIPCION		90,485,840.14
H	SUB CUENTA - CANON MINERO	101,490,026.90	67,723,916.23
P	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	27,584,544.51	22,158,505.27
J	SUB CUENTA - CANON PESQUERO		
O	SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	59,073.65	4,504.02
L	SUB CUENTA - CANON FORESTAL	7.91	
V	SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL		8,964.40
U	SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL		5,356.77
18-10	SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI		13,562.00
18-13	SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	703,815.00	584,593.45
18-Y	SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	288.26	
FTE FTO	07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		
T.R.	DESCRIPCION		6,341,254.62
07-A	SUB CUENTA - FONCOMUN	7,513,261.79	6,335,386.01
07-3	SUB CUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS - FONCOMUN	317.86	5,868.61

REPORTE DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE ENERO - ABRIL 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

FTE FTO	19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
T.R.	DESCRIPCION		4,852,851.51
19-F	SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	2,024,176.92	3,294,914.27
19-G	SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	1,423,689.00	
19-11	SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD		10,440.00
19-15	SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)		1,547,497.24
19-20	SUB CUENTA - EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 - ROOC		4,852,851.51
FTE FTO	00 - RECURSOS ORDINARIOS		
T.R.	DESCRIPCION	932,549.00	6,063,075.09
L-P-S	SUB CUENTA - VASO DE LECHE	932,549.00	494,917.98
00-N	SUB CUENTA - PROY. DE TRANSPORTE RURAL PRO VIAS		
00-I	SUB-CUENTA Apoyo Extraordinario TP_GL		
00-B	SUB CUENTA - TRANSF. DE PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES	10,758,108.00	5,568,157.11
00-16	SUB CUENTA - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA (R.O.)		6,063,075.09
00-6	CONTINUIDAD DE INVERSIONES GOB. LOCALES Y OTROS		494,917.98
00-20	SUB CUENTA - INCENTIVOS PRESUPUESTARIOS PARA INVERSIONES		
FTE FTO	08 - IMPUESTOS MUNICIPALES		
T.R.	DESCRIPCION	3,832,611.26	2,933,319.11
08-3	SUB CUENTA - TRAGAMONEDAS	290509.63	
08-7	SUB CUENTA - IMPUESTOS MUNICIPALES	3,542,101.63	2,933,319.11
FTE FTO	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
T.R.	DESCRIPCION	17,747,338.08	5,802,916.46
09-7	SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR	17,747,338.08	5,802,916.46
FTE FTO	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
T.R.	DESCRIPCION	12,637,452.13	0.00
13-18	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - MDSA	12,284,927.24	475,362.95
13-25	SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9° RD 004-2022-EF/52.01	352,524.89	
TOTAL		186,707,260.87	116,954,619.88



SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES





SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES


TOTAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN, Ejecución de gasto de enero hasta agosto del año 2022 es de S/ 123,199,178 con un avance de ejecución de gasto del 47.4 % por toda Fuentes de Financiamiento de Proyectos, Actividades..

N°	Tipos de Procedimientos de Selección	Cantidad de Programados PAC 2022	Cantidad Convocados Contratados	Estado Situacional
1	Contratación Directa	07	04	Contratado
2	Adjudicación Simplificada	71	41	Contratado Convocado
3	Concurso Público	05	03	Contratado
4	Licitación Pública	09	06	Actos preparatorios Contratado Convocado
5	Subasta Inversa Electrónica	74	55	Actos preparatorios Contratado Convocado
	TOTAL	166	109	
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PAC 2022				73.28%





Procesos programados por mes resaltando el mes de agosto

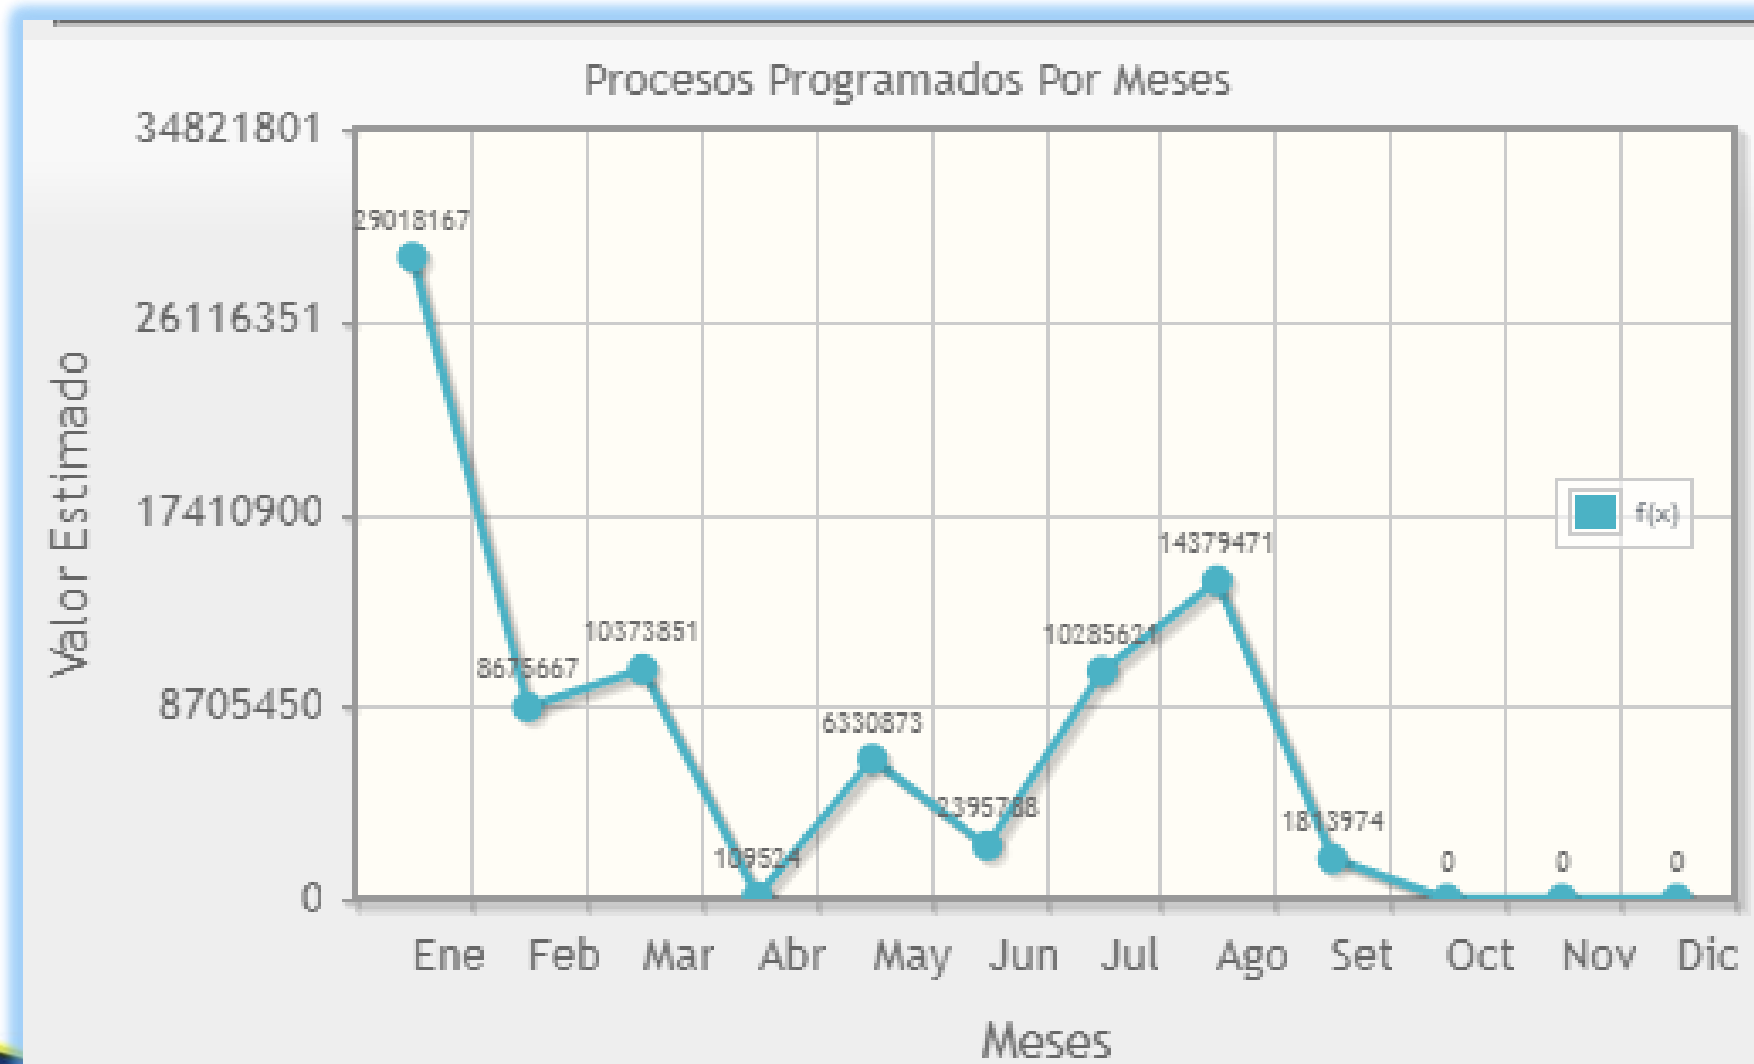



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



ACCIONES Y LOGROS

- Entrega de 11,240 cuponerías a todos los contribuyentes de nuestra jurisdicción.
- Organización de fotos de cada uno de los predios de la jurisdicción de Moquegua el cual fue pilar para reconocimiento de subvaluados.
- Proyectos de Ordenanza.
- Ejecución de la I Campaña de Beneficio e incentivo Tributario del año 2022, (beneficios, obsequios).
- Capacitación al personal de la Gerencia de Administración Tributaria
- Implementación de trabajo en la emisión de notificaciones.
- Implementación de acciones de mejor atención al público contribuyente, Cartas inductivas a predios subvaluados y omisos.
- Difusión publicitaria.





ACCIONES Y LOGROS

- Atención al público contribuyente de manera permanente, por cierres de campaña, los días sábados y feriados.
- Actualización y Emisión masiva de valores 2022.
- Registro de Determinación de deuda.
- Gestión de cuenta (cobranza ordinaria y control de deuda).
- Emisión y notificación de valores de cobranza.
- Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
- Proceso de fiscalización a espectáculos públicos No Deportivos
- Gestión ante diversas entidades e instituciones para la obtención de información que coadyuve a detectar a los contribuyentes omisos al pago del Impuesto Predial



AVANCE DE LA RECAUDACIÓN MENSUAL




ITEM	CONCEPTO	RECAUDACIÓN								TOTAL RECAUDACIÓN
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
1	IMPUESTO PREDIAL	S/. 93,314.24	S/. 130,982.86	S/. 384,760.17	S/. 549,138.89	S/. 211,998.73	S/. 213,022.37	S/. 214,337.07	S/. 157,281.24	S/. 1,954,835.57
2	IMPUESTO DE ALCABALA	S/. 50,749.67	S/. 77,046.98	S/. 58,204.20	S/. 155,696.32	S/. 99,878.15	S/. 208,095.51	S/. 89,149.88	S/. 41,996.35	S/. 780,817.06
3	IMPUESTO VEHICULAR	S/. 29,888.13	S/. 56,176.37	S/. 232,398.00	S/. 33,986.17	S/. 43,116.88	S/. 41,766.48	S/. 56,244.97	S/. 39,053.49	S/. 532,630.49
4	IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 4,154.00	S/. 215.00	S/. 1,655.00	S/. 6,024.00
5	IMPUESTOS A LOS JUEGOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
6	LIMPIEZA PUBLICA	S/. 10,595.33	S/. 26,931.12	S/. 58,714.93	S/. 34,675.91	S/. 28,427.20	S/. 27,290.16	S/. 22,962.28	S/. 31,020.38	S/. 240,617.31
7	PARQUES Y JARDINES	S/. 13,112.81	S/. 33,899.64	S/. 84,929.31	S/. 55,995.92	S/. 47,440.05	S/. 35,071.85	S/. 39,639.25	S/. 50,194.02	S/. 360,282.85
8	RECOJO DE RESIDUO SOLIDO	S/. 7,686.78	S/. 18,215.65	S/. 45,668.88	S/. 31,238.55	S/. 24,328.95	S/. 21,948.95	S/. 21,014.33	S/. 30,921.33	S/. 201,023.42
9	SERENAZGO	S/. 6,658.32	S/. 17,351.04	S/. 71,379.05	S/. 35,385.80	S/. 33,132.18	S/. 17,816.51	S/. 20,648.98	S/. 35,892.68	S/. 238,264.56
10	COBRANZA COACTIVA COSTAS PROCESALES	S/. 598.90	S/. 338.60	S/. 1,344.80	S/. 1,008.10	S/. 1,089.50	S/. 1,078.20	S/. 1,489.90	S/. 1,316.25	S/. 8,264.25
11	PLANILLAS DE ESPECIES VALORADAS	S/. 3,815.18	S/. 7,093.20	S/. 14,044.40	S/. 8,782.20	S/. 7,915.30	S/. 6,982.52	S/. 6,706.90	S/. 8,704.90	S/. 64,044.60
12	ALQUILER DE INMUEBLES - ADM. TRIBUTARIA	S/. 19,040.00	S/. 6,560.00	S/. 8,110.00	S/. 4,240.00	S/. 9,190.00	S/. 21,405.00	S/. 6,300.00	S/. 13,680.00	S/. 88,525.00
13	INTERESES POR SANCIONES	S/. 5,016.19	S/. 3,434.67	S/. 3,441.90	S/. -	S/. 70.76	S/. 262.86	S/. 104.53	S/. 1,726.79	S/. 14,057.70
14	DERECHO DE CERTIFICACION DE POSESION Y NEGATIVO	S/. 236.60	S/. 1,132.30	S/. 1,892.80	S/. 1,574.10	S/. 965.70	S/. 625.30	S/. 1,014.00	S/. 760.50	S/. 8,201.30
15	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
16	CERTIFICACIONES DIVERSAS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
17	COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3.90	S/. 4.90	S/. -	S/. 8.80
18	MULTAS A ESTABLECIMIENTOS Y OTROS	S/. 376.00	S/. 2,884.00	S/. 3,846.00	S/. 3,138.00	S/. 1,062.00	S/. 3,174.00	S/. 3,960.00	S/. 2,852.00	S/. 21,292.00
20	OTROS INGRESOS DIVERSOS - MPMN	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
21	VENTAS DE INMUEBLES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
22	DERECHO DE TRAMITE DOCUMENTARIO	S/. 1,199.10	S/. 1,822.70	S/. 2,129.70	S/. 2,472.70	S/. 1,920.50	S/. 1,979.20	S/. 1,778.20	S/. 2,229.30	S/. 15,531.40
23	OTROS SERVICIOS	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
24	DERECHO DE BUSQUEDA	S/. 19.30	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 19.30	S/. -	S/. -	S/. 38.60
25	DERECHO DE RECONSIDERACION - APELACION - REVISION	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 16.90	S/. -	S/. 16.90
26	OTRAS LICENCIAS ESPECIALES	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
	TOTAL	S/. 242,306.55	S/. 383,869.13	S/. 970,864.14	S/. 917,332.66	S/. 510,535.90	S/. 604,696.11	S/. 485,587.09	S/. 419,284.23	S/. 4,534,475.81

INGRESO POR TRIBUTOS MUNICIPALES AÑO 2022 (ENERO-AGOSTO)



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES POR PARTIDAS ENERO -AGOSTO 2022

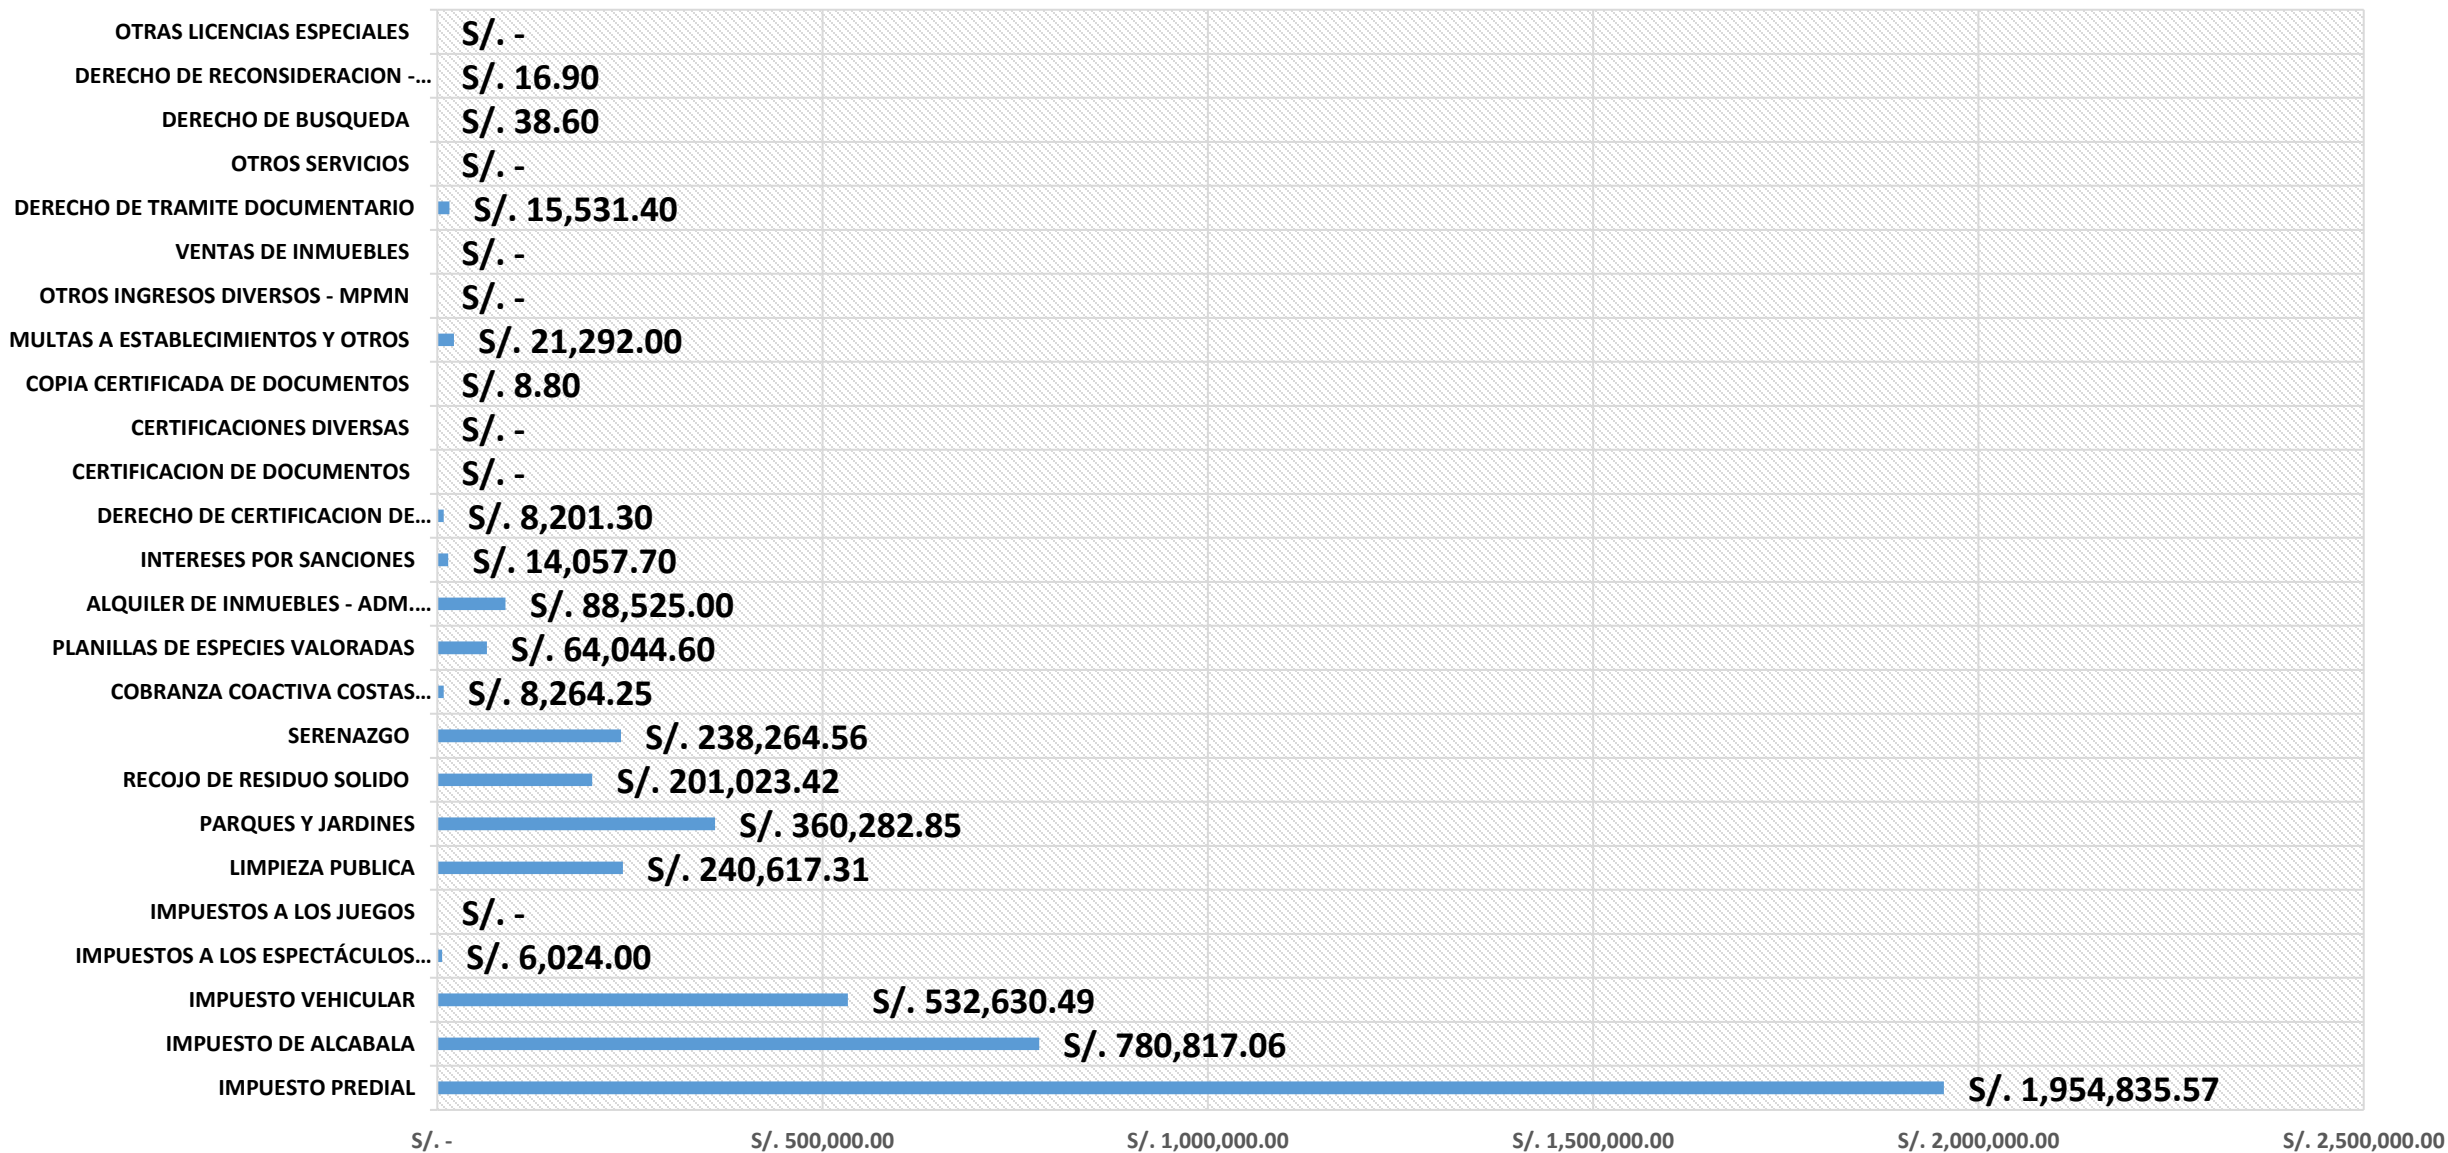




RECAUDACIÓN MENSUAL POR TRIBUTOS MUNICIPALES ENERO – AGOSTO DEL AÑO 2022

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL RECAUDACIÓN
S/.242,306.55	S/.383,869.13	S/.970,864.14	S/.917,332.66	S/.510,535.90	S/.604,696.11	S/.485,587.09	S/.419,284.23	S/.4,534,475.81

RECAUDACIÓN MENSUAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES ENERO -AGOSTO 2022

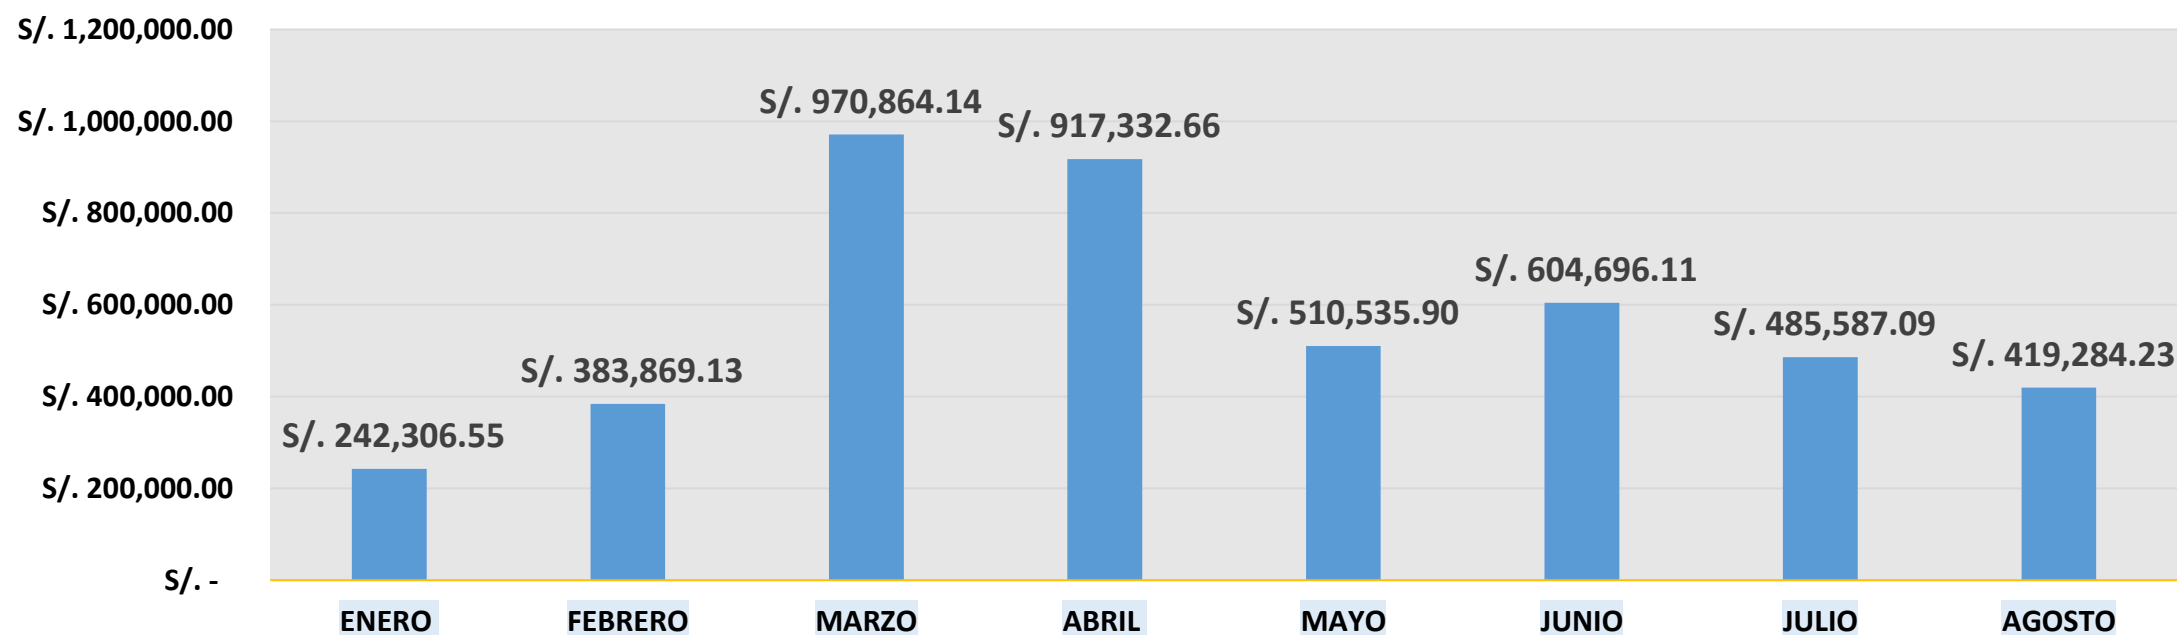




IMPUESTO PREDIAL

EMISIÓN MASIVA 2022 - RECAUDACIÓN AÑO 2022 (ENERO - AGOSTO)

IMPUESTO PREDIAL			
MONTO DE EMISIÓN	RECAUDACIÓN	AVANCE	MOROSIDAD
5,595,004.44	1,458,679.80	26%	74%

RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL PRESENTE EJERCICIO 2022 (ENERO - AGOSTO)

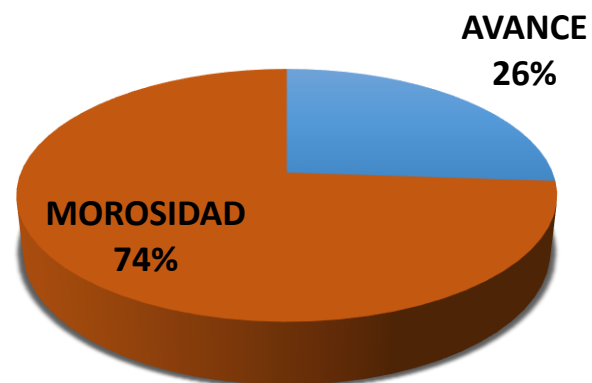

■ AVANCE ■ MOROSIDAD





ARBITRIOS MUNICIPALES

ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2022 - (MES DE ENERO A AGOSTO)				
TIPO DE ARBITRIOS	MONTO DE EMISIÓN AÑO 2022	RECAUDACIÓN	AVANCE %	MOROSIDAD%
LIMPIEZA PÚBLICA	S/. 620,412.72	S/. 154,595.74	24.92	75.08
PARQUES Y JARDINES	S/. 1,170,609.72	S/. 217,383.76	18.57	81.43
RECOJO DE RR.SS	S/. 645,554.88	S/. 118,258.06	18.32	81.68
SERENAZGO	S/. 804,473.28	S/. 151,286.30	18.81	81.19
TOTAL	S/. 3,241,050.60	S/. 641,523.86	20	80

RECAUDACIÓN ARBITRIOS MUNICIPALES






TABLA DE AVANCE DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES – SEGÚN PIM

ITEM	CONCEPTO	PIM 2022	RECAUDACIÓN								TOTAL RECAUDACIÓN	AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
1	IMPUESTO PREDIAL	S/. 3,841,124.51	S/. 93,314.24	S/. 130,982.86	S/. 384,760.17	S/. 549,138.89	S/. 211,998.73	S/. 213,022.37	S/. 214,337.07	S/. 157,281.24	S/. 1,954,835.57	S/. 50.89
2	IMPUESTO DE ALCABALA	S/. 563,078.78	S/. 50,749.67	S/. 77,046.98	S/. 58,204.20	S/. 155,696.32	S/. 99,878.15	S/. 208,095.51	S/. 89,149.88	S/. 41,996.35	S/. 780,817.06	S/. 138.67
3	IMPUESTO VEHICULAR	S/. 616,721.30	S/. 29,888.13	S/. 56,176.37	S/. 232,398.00	S/. 33,986.17	S/. 43,116.88	S/. 41,766.48	S/. 56,244.97	S/. 39,053.49	S/. 532,630.49	S/. 86.36
4	LIMPIEZA PUBLICA	S/. 486,448.42	S/. 10,595.33	S/. 26,931.12	S/. 58,714.93	S/. 34,675.91	S/. 28,427.20	S/. 27,290.16	S/. 22,962.28	S/. 31,020.38	S/. 240,617.31	S/. 49.46
5	PARQUES Y JARDINES	S/. 785,481.96	S/. 13,112.81	S/. 33,899.64	S/. 84,929.31	S/. 55,995.92	S/. 47,440.05	S/. 35,071.85	S/. 39,639.25	S/. 50,194.02	S/. 360,282.85	S/. 45.87
6	RECOJO DE RESIDUO SOLIDO	S/. 381,242.41	S/. 7,686.78	S/. 18,215.65	S/. 45,668.88	S/. 31,238.55	S/. 24,328.95	S/. 21,948.95	S/. 21,014.33	S/. 30,921.33	S/. 201,023.42	S/. 52.73
7	SERENAZGO	S/. 366,879.69	S/. 6,658.32	S/. 17,351.04	S/. 71,379.05	S/. 35,385.80	S/. 33,132.18	S/. 17,816.51	S/. 20,648.98	S/. 35,892.68	S/. 238,264.56	S/. 64.94
	TOTAL	S/. 7,040,977.07	S/. 212,005.28	S/. 360,603.66	S/. 936,054.54	S/. 896,117.56	S/. 488,322.14	S/. 565,011.83	S/. 463,996.76	S/. 386,359.49	S/. 4,308,471.26	





ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Programa Emisión de cuponeras año 2022

- Emisión de cuponeras a más de 10,000.00 predios, ello con el apoyo de todo el personal de la Gerencia de Administración Tributaria con la entrega de cuponeras en cada domicilio, con la emisión del HR y PU (Declaración Juradas) de Avalúo, monto del impuesto predial del año 2022, así como el monto por arbitrios municipales.



CAMPAÑA DE BENEFICIO E INCENTIVO TRIBUTARIO 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



CAMPAÑA TRIBUTARIA 2022

SORTEO: 30-NOVIEMBRE-2022

BENEFICIOS:

- CONDONACIÓN 100% DE INTERESES, MORAS Y MULTAS POR PAGOS ATRASADOS.
- BONO DE DESCUENTO DE DOS (2) MESES EN ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2020, 2021 Y 2022.
- FRACCIONAMIENTO DE DEUDA.

GANAR:

- 01 Auto 0.00 Kilómetros
- 01 Trompo mezclador de concreto
- 01 Juego de sala
- 02 Kits De Herramientas de Construcción (Consta de una Carroñita Tipo Buggy, 01 Pico, 01 Lampa y 02 Bolsa de Cemento)
- 02 Impresoras Multifuncional
- 02 Cocinas de 4 hornallas
- 02 Refrigeradoras
- 02 Lavadoras
- 20 Artefactos Electrodomésticos
- 06 Sacos de arroz de 50 Kilos cada uno
- 10 Kits de utensilios de cocina
- 10 Mochilas de Emergencia

CONSULTA A OPERADORES:

- 977853926
- 953655994
- 993042423
- 953918418

GAT Gerencia de Administración Tributaria

MOQUEGUA
GESTIÓN 2019 - 2022

PAGANDO NUESTROS TRIBUTOS GENERAMOS EL DESARROLLO DE MOQUEGUA

GANADORES DE UN AUTO 0.00 KM

2019 RUFINA COPA PATE

2020 EDUARDO CASTRO BINGUA


2021 JOSE RODRIGUEZ SOTO

HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES-VIERNES 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sábados 8:a.m. - 12:00 p.m.

MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir
GESTIÓN 2019 - 2022

INCENTIVOS A BUENOS CONTRIBUYENTES

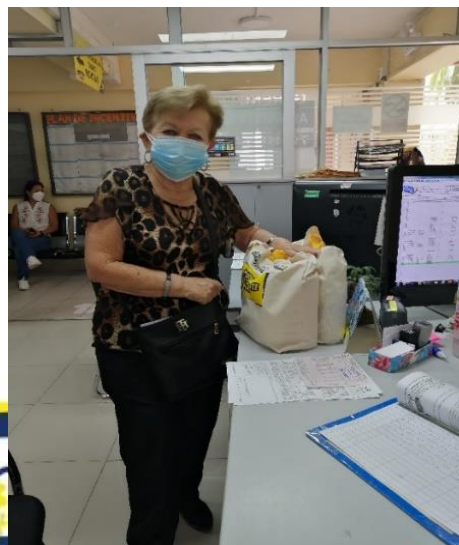



ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN EL FRONTIS DEL MURO MATRIZ, RESPECTO A TRIBUTOS MUNICIPALES, CON LA ENTREGA DE TICKETS A LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES





PROCESO DE NOTIFICACIÓN CON TODO EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA ENTREGA DE VALORES DE COBRANZA – ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN, ASI COMO DIFERENTES NOTIFICACIONES POR LOS SECTORES DE MOQUEGUA.



PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS PARA SER SORTEADOS EN LA CAMPAÑA TRIBUTARIA 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO





SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO

1. Se elaboró el Plan de Trabajo para el año 2022, denominado “GESTION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE FISCALIZACION Y CONTROL TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”
2. Gestión Administrativa de la Fiscalización y Control Tributario, se viene cumpliendo con la gestión y las coordinaciones del área.
3. Se reforzó la comunicación con los arrendatarios de los locales de Comercial Azul, Av. Balta, y parque de la juventud teniendo así un ingreso al 31 de agosto de **s/. 81,485.00 nuevos soles**
4. Se reforzó la fiscalización de eventos no deportivos, actividades que durante la pandemia estuvieron paralizadas, fiscalizando así 11 espectáculos, logrando un ingreso total producto del cobro del impuesto predial de **7,422.00 soles**
5. Se gestionó ante diversas entidades, e instituciones, como Electrosur, EPS, Sunarp, Municipalidades, COFOPRI, logrando recabar información para la detección de OMISOS prediales.





FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR

1. Incremento de la base tributaria con las fiscalizaciones en las actualizaciones de las características de los predios.
2. Se notificaron 1071 cartas para actualización predial, inscripción de omiso, actualización por licencia de construcción, vehiculares y reiterativas de la actualización predial y beneficiarios de descuento predial, como parte del proceso de fiscalización.
3. Se notificaron 362 cartas inductivas prediales.
4. Se logró actualizar 166 predios en el sistema MIMITSAT, a agosto 2022.
5. Con la fiscalización que se realizó hasta el mes de agosto 2022, se logró incrementar aproximadamente 20148.03 m², correspondientes a m² de construcción de las declaraciones recibidas en el proceso de fiscalización y 2740.02 m² correspondientes a los omisos detectados en el proceso de fiscalización, sumando un total de 78,032.64 nuevos soles.

Nº	INGRESO ANUAL GENERADO PARA RECAUDACIÓN 2021	MONTO EN S/.
1	Inscripción y Actualización Impuesto Predial	s/. 78.032.64
2	Pago de alquileres de tiendas del Mercado y comercial azul	s/. 81,485.00





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



**“SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”**

PRESUPUESTO ASIGNADO FONCOMUN	S/. 87 632.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 55 380.98
PRESUPUESTO ASIGNADO RDR	S/. 91 332.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 71 778.93
% DE AVANCE FONCOMUN	63.19 %
% DE AVANCE RDR	78.59 %
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> -DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL -DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES -DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA --DEMUNA -CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) -DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES -SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES-SISFOH
--	--



LOGRO OBTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> -FESTIVAL GASTRONOMICO DE PROGRAMAS SOCIALES -PARTICIPACION SELLO MUNICIPAL SEXTA EDICION 2022 -SUPERVISION A LOS DEPARTAMENTOS A CARGO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS
---------------------------	--



PANEL FOTOGRAFICO



Festival gastronómico Comedores Populares



PARTICIPACION DE LA INSTITUCION EN SELLO MUNICIPAL SEXTA EDICION



PARTICIPANDO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



ÁREA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS

ENERO – AGOSTO 2022



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

En el periodo de Enero – Agosto del presente se realizo las siguientes actividades:

1. Taller de Oratoria Y Liderazgo a los Alcaldes Escolares de la ciudad de Moquegua.
2. Dictado de clases de oratoria KIDS a los niños y niñas de Instituciones Educativas durante el programa de vacaciones útiles promovido por la municipalidad.
3. Exposición Pictórica en la plaza de armas del nacimiento y vida del Amauta José Carlos Mariátegui.
4. Concurso de dibujo y pintura para niños de instituciones educativas realizado en la plaza de armas.





LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

- Taller de Oratoria y Liderazgo a los Alcaldes Escolares de la ciudad de Moquegua.





LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

- Dictado de clases de oratoria KIDS a los niños y niñas de Instituciones Educativas durante el programa de vacaciones útiles promovido por la municipalidad.





LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

- Exposición Pictórica en la plaza de armas del nacimiento y vida del Amauta José Carlos Mariátegui.





LOGROS ALCANZADOS ENERO – AGOSTO 2022

- Concurso de dibujo y pintura para niños de instituciones educativas realizado en la plaza de armas.





DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA





Realización de Campañas de Promoción, Difusión y Prevención.

Se realizaron 04 Campañas de prevención y promoción de derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes en donde participaron instituciones como: Comisaria de Familia, Región Policial, Dirección Regional de Trabajo, Centro de Emergencia Mujer, Ministerio Público a través de la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y testigos y el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA de Mariscal Nieto.

- Pasacalle: Alto al castigo físico y humillante.
- Recorrido de Sensibilización por el día del Niño Peruano “LOS NIÑOS SON ASOMBROSOS, PROTEGELOS”
- Capacitación a la Liga Departamental de Fútbol de menores de Moquegua, orientada a sensibilizar sobre los derechos y deberes de Niñas, Niños y adolescentes así como temas de violencia y la identificación de signos de la misma.
- II Encuentro de Defensores Municipales.





Atención Integral de Casos.

En el presente año la DEMUNA Mariscal Nieto viene atendiendo 160 casos de acuerdo al siguiente detalle:

- Conciliación: 12 casos
- Riesgo de Desprotección Familiar: 147 casos
- Matricula Escolar: 01 caso

Beneficiando y atendiendo a 221 Niñas, Niños y Adolescentes.





Realización de Eventos Sociales, Cívicos y de Protección Social.

Se realizó dos actividades de acuerdo al siguiente detalle:

- 01 Show Infantil por el día Internacional del derecho al Juego.


Logrando crear el Show Infantil de la DEMUNA, orientado a promocionar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través del juego y conformado por el personal profesional de la DEMUNA.

- Pasacalle de sensibilización: “Ámalo, Cuídalo, Cultívalo - Moquegua dice no al abuso infantil”.





VISITAS DOMICILIARIAS



ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PASACALLE: "ALTO AL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE".



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

DEMUJERAS

PASACALLE DE
SENSIBILIZACIÓN

"ALTO AL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE"

LUNES 28 DE FEBRERO

LUGAR:
PLAZA DOS DE
MAYO

HORA: 09:00 A.M.

ABRAHAM CÁRDENAS ROMERO
ALCALDE PROVINCIAL 2019 - 2022

MOQUEGUA
al mejor lugar para
VIVIR



MOQUEGUA
el mejor lugar para *vivir*

PRIMER TEATON MOQUEGUA 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

RECORRIDO DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO PERUANO, “LOS NIÑOS SON ASOMBROSOS, PROTEGELOS”.



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

II ENCUENTRO DE DEFENSORES MUNICIPALES 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

AGOSTO
24, 25 y 26

II ENCUENTRO DE DEFENSORES MUNICIPALES

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

TEMAS:

- 1 IMPORTANCIA DEL D.L. N° 1297, DECRETO LEGISLATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS.
- 2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE USAN EN EL PROCEDIMIENTO POR RIESGO DE DESPROTECCIÓN.
- 3 ROL DE LOS ACTORES QUE INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO DE RIESGO POR DESPROTECCIÓN FAMILIAR.
- 4 DESARROLLO DE MESA DE DIALOGO - ANÁLISIS DE NUDOS CRÍTICOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN ATENCIÓN DE CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN.

MODALIDAD: Presencial.
PONENCIA: Se contará con la participación del MIMP.
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural Santo Domingo.
HORA: 8:00am - 5:00pm.

Municipalidad Provincial MARISCAL NIETO | DEMUNA | MOQUEGUA el mejor lugar para VIVIR



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

“SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO – PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROGRAMA VASO DE LECHE”

PCA PRESUPUESTO ASIGNADO R.O	S/. 485 722.00
PCA PRESUPUESTO EJECUTADO R.O	S/. 464 237.00
PCA PRESUPUESTO ASIGNADO RDR	S/. 66 734.00
PCA PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 42 217.84
% DE AVANCE R.O	95.58 %
% DE AVANCE RDR	63.26 %
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PCA	- 46 COMEDORES EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO



LOGRO OBTENIDO

- SE ATENDIO 13 728 RACIONES AL 31 DE AGOSTO 2022
- SE CAPACITO AL 100%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



“SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO –PROGRAMA VASO DE LECHE”

PVL PRESUPUESTO ASIGNADO R.O	S/. 391 725.00
PVL PRESUPUESTO EJECUTADO R.O	S/. 391 720.83
PVL PRESUPUESTO ASIGNADO RDR	S/. 67 834.00
PVL PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 62 068.70
% DE AVANCE R.O	99.99 %
% DE AVANCE RDR	91.50 %
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PVL	- 38 COMITES DE VASO DE LECHE PROVINCIA MARISCAL NIETO



LOGRO OBTENIDO

-SE ATENDIO 9752 RACIONES AL 31 DE AGOSTO 2022
-SE LOGRO SUPERVISAR AL 60%





“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO”

PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 3,413,221.87
PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 2,103,629.85
BENEFICIARIOS	DIRECTOS : 8,964 INDIRECTOS : 35,856
PLAZO DE EJECUCION	720 DIAS
FECHA DE INICIO	18 de febrero 2021
FECHA DE TERMINO	08 de febrero 2023
MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA
AVANCE FISICO	80.14 %
AVANCE FINANCIERO	61.63 %



LOGRO OBTENIDO

COMPONENTE N°01 EQUIPAMIENTO	: 96.16%
COMPONENTE N° 02 CAPACITACION	: 63.31 %
COMPONENTE N° 03 SENSIBILIZACION	: 75.47 %





SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO



“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 2'704,236.78
PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 582,818.99
BENEFICIARIOS	DIRECTOS : 3,546 INDIRECTOS : 35,856
PLAZO DE EJECUCIÓN	720 DIAS
FECHA DE INICIO	01 OCTUBRE 2021
FECHA DE TERMINO	20 SETIEMBRE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AVANCE FÍSICO	24.85%
AVANCE FINANCIERO	21.55%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

**LOGRO
OBTENIDO**

COMPONENTE N°01 PROMOCION Y GESTION : 28.48 %
 COMPONENTE N° 02 CAPACIDAD TECNICA : 23.05 %
 COMPONENTE N° 03 EQUIPAMIENTO : 20.09 %



COMP 01: GESTIÓN Y PROMOCIÓN

FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS EN FERIAS AGROPECUARIAS LOCALES	42.7%
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y ARTESANAL EN LA PROVINCIA MCAL NIETO	56.1%
FORMALIZACIÓN DE MYPES Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES	61.1%
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON PLANES DE NEGOCIO	33.3%
ARTICULACIÓN PARA RIEGO TECNIFICADO EN PARCELA E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	3.6%

COMP 02: CAPACIDAD TÉCNICA

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Y FERIA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE LA UVA	100.0%
VISITA DE CAMPO A PRODUCTORES DE PALTO	25.0%
TALLER INNOVACION PARA EL CULTIVO DE PALTO, VID Y CUCURBITACEAS	30.0%
APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL CULTIVO DEL PALTO	22.2%
APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL CULTIVO DE LA UVA DE MESA	29.2%

COMP 03: EQUIPAMIENTO

ADQUISICIÓN DE MAQUINAS EQUIPOS E INSTRUMENTOS	20.9%
--	-------



PANEL FOTOGRÁFICO



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS EN FERIAS AGROPECUARIAS



FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y ARTESANAL



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



FORMALIZACIÓN DE MYPES Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES



GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CON PLANES DE NEGOCIO



ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Y FERIA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE LA UVA



TALLER INNOVACIÓN PARA EL CULTIVO DE PALTO, VID Y CUCURBITÁCEAS



APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL CULTIVO DE UVA



APLICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL CULTIVO DE PALTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE MUYLACUE - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 3'016,187.97
PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 84,853.67
BENEFICIARIOS	DIRECTOS : 96 USUARIOS
PLAZO DE EJECUCION	150 DIAS
FECHA DE INICIO	08 AGOSTO 2022
FECHA DE TERMINO	04 ENERO 2023
MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA
AVANCE FISICO	1.14 % (AGOSTO)
AVANCE FINANCIERO	2.81 % (AGOSTO)



LOGRO OBTENIDO

ACTUALMENTE: SE ENCUENTRA EN SU PRIMER MES DE EJECUCIÓN (INICIO 09 AGOSTO)

COMPONENTE N° 01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	: 1.14 %
COMPONENTE N° 02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	: 0.00 %
COMPONENTE N° 03 CAPACITACION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION	: 0.00 %



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIESGO

Canal lateral de conducción revestidos de concreto

- Construcción de **2324.39 m** de canales laterales de concreto $f'c=175$ kg/cm² con sección de 30cmx40cm y sección de 40cmx40cm, que son provenientes del canal principal existente Trampani.

Canal lateral de conducción entubado

- Construcción de **1879.28 m** de longitud inclinada de canal entubado con tubería HDPE de 200mm, sección de 40cmx60cm relleno con material seleccionado.

Obras de alimentación o captación

- Construcción de una toma lateral de concreto armado tipo I 40cmx40cm, emboquillado $f'c=175$ kg/cm² pisos y muros $f'c=210$ kg/cm² con compuerta tipo tarjeta de plancha metálica.
- Construcción de 6 tomas lateral de concreto armado tipo 2 30cmx40cm, emboquillado $f'c=175$ kg/cm² pisos y muros $f'c=210$ kg/cm² con compuerta tipo tarjeta de plancha metálica.

Obras de arte

- Construcción de 1 canoa de concreto armado
- Construcción de 12 pasos peatonales de concreto armado, El ancho del paso peatonal tendrá un ancho de 1.20 m.
- Construcción de 7 pozas disipadoras y rápidas de concreto
- Construcción de un Aforador RBC de concreto Armado, de 50 cm de ancho con altura variada, para el control de caudal.
- Construcción de 18 Caídas Verticales Tipo I (Z=1.20m), Tipo II (Z=0.90m, Lp=3.15m), Tipo III (Z=1.70m) Tipo IV (Z=1.20m, Lp=370m) Concreto armado.

Compuertas para tomas

- Suministro de 14 instalaciones de compuertas metálicas Tipo I tarjeta de 0.40x0.50m de doble marco.
- Suministro de 133 instalaciones de compuertas metálicas Tipo II tarjeta de 0.30x0.50m de doble marco.





COMPONENTE II: MITIGACION AMBIENTAL

En la cual se detallarán las acciones y actividades que se realizarán para reducir o remediar los impactos negativos que pueden causar al entorno ecológico y sociocultural durante la ejecución del proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. También se estimará los costos para la ejecución de este componente.

COMPONENTE III: CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACION.

Se realizarán eventos de capacitación y sensibilización a 480 habitantes que serán beneficiarios directos con la ejecución del proyecto en temas de manejo y uso eficiente de los recursos hídricos con fines agropecuarios, manejo y conservación de suelos agrícolas, mejoramiento de capacidades de las unidades productoras y gestión de mercado, Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego.

DATOS FINANCIEROS

Fuente de Financiamiento

Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y participaciones.

Entidad Gestora

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Entidad Ejecutora

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Presupuesto Total

El costo total, contempla los 03 componentes el cual asciende a **S/. 3'016,187.97, (Tres millones dieciséis mil ciento ochenta y siete con 97/100 soles).**

COSTO DIRECTO

EVALUACION	RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO			
	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
	%	VALORIZADO	%	VALORIZADO
AVANCE DEL MES ANTERIOR (ACUMULADO)	0.00%	-	0.00%	-
MES	AGOSTO			
AVANCE	1.14%	29,144.11	2.81%	84,853.67
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA	1.14%	29,144.11	2.81%	84,853.7
SALDO	98.86%	2,528,156.74	97.19%	2,472,447.18
PRESUPUESTO TOTAL	100.00%	2,557,300.85	100.00%	2,557,300.85



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

PANEL FOTOGRÁFICO



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



PARTIDA : CARTEL DE OBRA EN ZONA DEL PROYECTO



PARTIDA : EXTRACCION Y ELIMINACION DE ARBUSTOS Y MALEZAS. EN CANALES



PARTIDA: CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA CANALES



PARTIDA : LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (CANALES)



PARTIDA : LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN CANALES EXISTENTES



PARTIDA : CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CANALES



PARTIDA : EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANAL ENTUBADO



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

“MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y CANAL DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO A GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE OCOLOLO, QUEABAYA MARCAS Y QUEABAYA VIZCARRA DE LA COMISIÓN DE RIEGO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA”



PPTO. TOTAL S/. **431.232.50**

PPTO. ASIGNADO S/. 431,234.00

EJECUCION ACUMULADA

AVANCE FISICO S/. 286,983.05 **80.86 %**

AVANCE FINANCIERO S/. 320728.93 **74.37%**

BENEFICIARIOS : Usuarios canal del Ocololo

UBICACIÓN

REGION	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL - CALACOA	BELLAVISTA

OBJETIVO

- Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de pública de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en este caso a través de garantizar el buen estado y funcionamiento del sistema de riego, de tal forma que contribuya con el mejoramiento de las actualmente en producción.

LOGROS ALCANZADOS

DESCRIPCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL	354,923.88	257,535.46	80.86%
OBRAS PROVINCIALES	7,249.86	4,592.52	63.35%
OBRAS PRELIMINARES	35,617.78	17,708.53	49.72%
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	11,221.09	11,221.09	100.00%
REPOSICION DE BOCATOMA	3,514.41	2,009.94	57.19%
MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCION EN TERRENO NATURAL	181,568.05	197,298.15	108.66%
MEJORAMIENTO DEL CANAL EXISTENTE DE CONCRETO	2,835.54	2,858.34	100.80%
MEJORAMIENTO DE LA POZA DE SEDIMENTACION	611.00	611.00	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAIDA INCLINADA	1,810.81	1,908.73	105.41%
REPOSICION DE TUBERIA PVC 300MM EN CANAL	1,813.23	1,813.23	100.00%
MEJORAMIENTO DE CRUCE AEREO	25,550.37	3,620.31	14.17%
VARIOS	13,893.62	13,893.62	100.00%
PARTIDAS NUEVAS 2021	30,501.19	9,684.13	31.75%
SERVICIOS DE PASE AÉREO P-01, P-02 Y P-03 (OCOLOLO)	43,059.24	12,106.28	28.12%
SERVICIOS DE PASE AÉREO P-04 Y P-05 (QUEABAYA)	44,256.11	522.43	1.18%
SERVICIOS DE PASE AÉREO P-01, P-02 Y P-03 (OCOLOLO)	13,826.93	4,110.99	29.73%
SERVICIOS DE PASE AÉREO P-04 Y P-05 (QUEABAYA)	17,242.70	23.76	0.14%
PARTIDAS NUEVAS 2022	7,667.30	3,000.00	39.13%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



PANEL FOTOGRÁFICO





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ÓRGANO EN LÍNEA ENCARGADO DE LA **GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA** DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Y TIENEN COMO FINALIDAD **SATISFACER A LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS** DE CADA PROYECTO.



- **VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.**
- **APLICAR LA DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA) MPMN**
- **EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**
- **CONTROLAR Y MONITOREAR LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (INVIERTE.PE).**
- **CONTROLAR Y MONITOREAR LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO**



PRESUPUESTO ASIGNADO 2022 PROYECTOS DE INVERSION




Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

DESCRIPCION	2021		2022	
	CANT	PIM 2021 (DIC)	CANT	PIM 2022 (31 AGOSTO)
OBRAS EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA	30	85,749,518.00	26	148'885,415.12
OBRAS EJECUCION POR CONTRATA	06	39,456,157.00	04	29'734,235.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION P.		3,371,590.23		3'650,864.00
	36	128,577,265.23	34	182'270,514.12

41.76%
INCREMENTO
DEL PRESUPUESTO

INVERSION PROGRAMADA PARA EL 2022 ES DE S/. 177'805,910.00 SOLES DONDE LA EJECUCION AL 31de AGOSTO ES DE 79'560,782.00 SOLES REPRESENTADO POR EL 44.80 %

REACTIVACION ECONOMICA

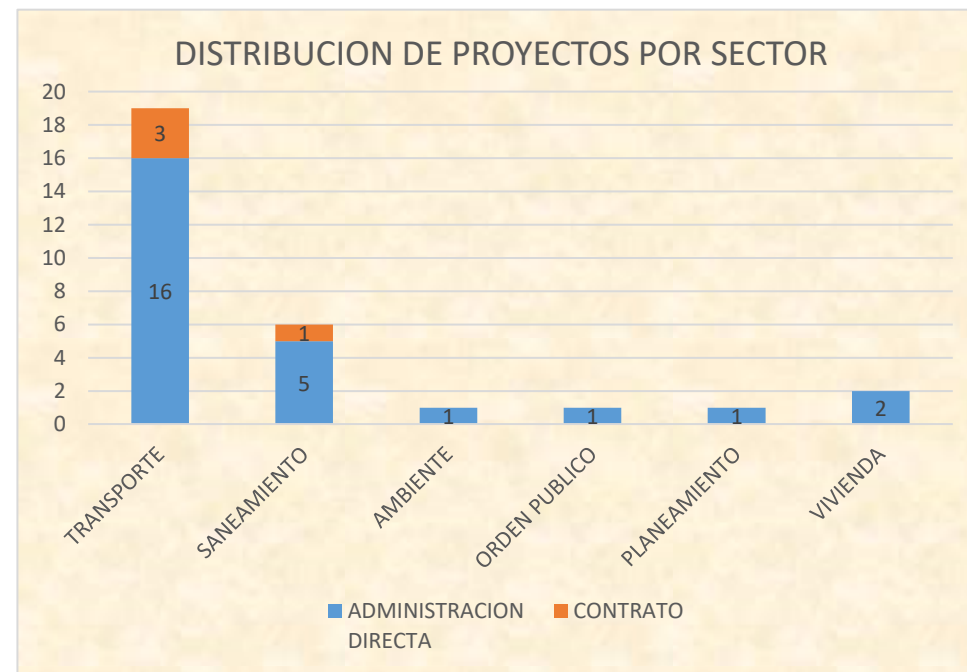

MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

EJECUCION POR SUBGERENCIAS Y OFICINAS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

EJECUTÓ: **56%**

16 ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN
32 07 VIABLES
 11 NUEVOS P/ ELABORACION

32 EXPEDIENTES TECNICOS
47 17 APPROBADOS
 15 EN ELABORACION

PROYECTOS INVERSION

SUB GERENCIA OBRAS PUBLICAS

EJECUTÓ: **72%**

28 OBRAS PUBLICAS
30 14 EN EJE. CONTINUIDAD
 12 EN EJECUCION 2022
 02 POR INICIAR

OF. MANTENIMIENTO

EJECUTÓ: **86%**

26 ACTIVIDADES
32 05 EN EJECUCION
 21 POR INICIAR

30 FICHAS PROG. P/ ELABORACION
48

D.U. 070- 2020

EJECUTÓ: **87%**

213.94 KILOMETROS
 MTTTO PERIODICO RUTINARIO

29 CAMINOS EJECUTADOS
35 CAMINOS PROGRAMADOS

DISMINUCIÓN DE BRECHAS SOCIALES
DESARROLLO DE LA CIUDAD



OF. SEGURIDAD Y SALUD

0% ACCIDENTES CONTAGIOS COVID **100%** SALUD OCUPACIONAL

CONCLUSIONES

- **INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN** DEL 2020 AL 2022 EN MAS DEL 60% CON LAS INVERSIONES PROGRAMADAS.
- **2020-2021-2022 SE HA OPTIMIZADO LOS RECURSOS** PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE PERMITAN EL CIERRE DE BRECHAS SOCIALES, SEGÚN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS.

GESTION DE MAS DE 250 MILLONES DE SOLES FUERA DEL PIM INSTITUCIONAL PARA PROYECTOS DE ENVERGADURA.

- **SE LOGRÓ Y CONSOLIDO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA** A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN GENERANDO PUESTOS LABORALES Y DESARROLLO ECONÓMICO A NIVEL DE LA FAMILIAS DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.

30 PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE HAN GENERADO PUESTOS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE MOQUEGUA.

- **POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA** EN UNO DE LAS CIUDADES CON EL MEJOR **INDICE DE PROGRESO SOCIAL** POR SU DISMINUCION DE BRECHAS, CON ACCESO A OPORTUNIDADES Y MEJOR CALIDAD DE VIDA.

PLANIFICACION A TRAVES DE EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN




MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

Estado Situacional de Enero a Abril del 2022

NIVEL DE PROYECTOS 2022		CANT.
ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN	APROBADOS/VIABLES	7
	EN ELABORACIÓN	11
EXPEDIENTES TÉCNICOS	APROBADOS CON RESOLUCIÓN	18
	EN ELABORACIÓN	14

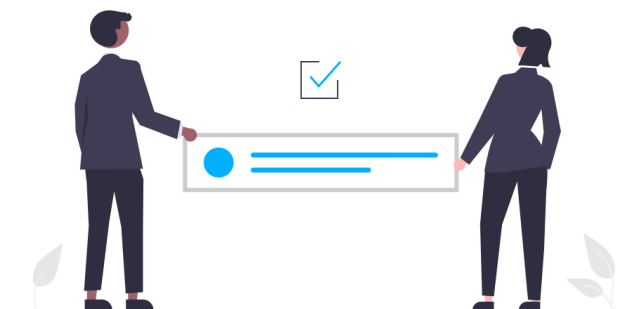

SECTOR DE TRANSPORTE

SECTOR DE SANEAMIENTO

6

PERFILES APROBADOS

1

PERFIL APROBADO

1. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES 2022

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN	SECTOR	UBICACIÓN
1	2248024	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ANEXO DE ESTUQUIÑA, JUNTA VECINAL ESTUQUIÑA URBANA, DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/15,173,951.53	07/04/2022	TRANSPORTES	ESTUQUIÑA - LOS ANGELES
2	2549355	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS AVENIDAS DE LA JUNTA VECINAL SECTOR II LIBERACIÓN Y AV. ALTA TENSIÓN DE LA ASOC. DE VIVIENDA VICENTE ZEBALLOS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/14,930,543.22	21/03/2022	TRANSPORTES	CHEN CHEN
3	2539594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD EN LOS PREDIOS RURALES DE LA PARTE BAJA DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/6,343,971.22	08/04/2022	TRANSPORTES	LOS ANGELES
4	2551058	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CALLE SAN MARTIN DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II DEL DISTRITO DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/686,093.07	08/04/2022	TRANSPORTES	PJ MARISCAL NIETO
5	2547594	CONSTRUCCION DE GRADERIAS; EN EL(LA) PASAJE SAN JUAN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/489,779.10	17/03/2022	TRANSPORTES	SAN FRANCISCO

1. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES 2022

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN	SECTOR	UBICACIÓN
6	2545113	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) . C.P. SAN FRANCISCO ASOCIACION 13 DE ABRIL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	S/135,887.16	17/03/2022	SANEAMIENTO	SAN FRANCISCO
7	2248024	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ANEXO DE ESTUQUIÑA, JUNTA VECINAL ESTUQUIÑA URBANA, DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/15,173,951.53	07/04/2022	TRANSPORTES	ESTUQUIÑA - LOS ANGELES

Logros:

7 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLES / APROBADOS



2. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN ELABORACIÓN

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR	ESTADO
1	114118	CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL DESDE LA AVENIDA SAN ANTONIO DE PADUA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, A OVALO Y CALLE F DEL SECTOR A-14 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINICA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	CHEN CHEN	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN POR CONVENIO CON SPCC
2	2520332	AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL SECTOR RURAL DEL C.P. LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	LOS ANGELES	SANEAMIENTO	EN ELABORACIÓN
3	2519353	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN
4	2518513	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL PRIMAVERA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CERCADO	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN
5	200973	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CHEN CHEN	SANEAMIENTO	EN ELABORACIÓN
6	200975	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA I, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	SAN FRANCISCO	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN
7	200982	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA RUTA: R1801258, EN LA JUNTA VECINAL DE CHARSA GUA Y ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES	LOS ANGELES	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN

2. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN ELABORACIÓN

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	SECTOR	ESTADO
8	200985	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA FRANCISCO FAHLMAN, AMPLIACIÓN VILLA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS, VILLA 4 DE NOVIEMBRE Y RAMIRO PRIALE DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	SAN FRANCISCO	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN
9	200989	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROMA AYMARA, CESAR VALLEJO, AL FONDO HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y MÚLTIPLES, VISTA ALEGRE I y II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, OLGA PRIMITIVA DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	SAN FRANCISCO	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN
10	200992	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL SECTOR A-3 (MANZANAS A, H, I, M, LL, X, Y), EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CHEN CHEN	TRANSPORTE	EN ELABORACIÓN
11	200994	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ESPÍRITU SANTO, 1RO DE JULIO, BARRIOS ALTOS, LAS LOMAS Y BICENTENARIO DEL SECTOR 1A-4 DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CHEN CHEN	SANEAMIENTO	EN ELABORACIÓN



II. EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2022


SECTOR DE TRANSPORTE

8 EXP. TEC APROBADOS
S/. 50,322,201.53




SECTOR DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

2 EXP. TEC APROBADOS
S/. 12,759,098.67



SECTOR DE SANEAMIENTO

5 EXP. TEC APROBADOS
S/. 9,734,216.76



CULTURA Y DEPORTE; Y AMBIENTE

3 EXP. TEC APROBADOS
S/. 11,432,810.81



3. EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
1	2151160	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA ASOCIACION DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	SANEAMIENTO	SAN FRANCISCO	3,331,601.18	RGM N°016-2022-GM-A/MPMN 18/01/2022
2	2520332	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	SANEAMIENTO	SAN ANTONIO	2,873,202.81	RGM N°012-2022-GM-A/MPMN 13/01/2022
3	2180790	INSTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS Y VILLA 4 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	SANEAMIENTO	SAN FRANCISCO	1,766,439.33	RGM N°122-2022-GM-A/MPMN 05/04/2022
4	2539391	CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	SANEAMIENTO	CUHCUMBAYA	831,711.73	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°188-2022-GM-A/MPMN 10/06/2022
5	2538709	CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) - DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARUMAS DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	SANEAMIENTO	CARUMAS	931,261.71	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°185-2022-GM-A/MPMN 10/06/2022
6	2518938	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	TRANSPORTE	CERCADO	2,765,613.98	RGM N°034-2022-GM-A/MPMN 02/02/2022



3. EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
7	2403226	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS JOSE CARLOS MARIATEGUI Y MARISCAL DOMINGO NIETO (CRUCE SAN ANTONIO DE PADUA - AVENIDA N° 01 DEL SECTOR 1B-PAMPAS SAN FRANCISCO), CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	SAN ANTONIO / SAN FRANCISCO	11,309,775.77	RGM N°077-2022-GM-A/MPMN 14/03/2022
8	2495572	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y EL PORVENIR DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	CHEN CHEN	11,042,964.17	RGM N°143-2022-GM-A/MPMN 05/05/2022
9	2192006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - EXPEDIENTE DE MODIFICACION POR ACTUALIZACION TRAMO I	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	LOS ANGELES / YACANGO	6,528,742.77	R.G.I.P. N°115-2022-GIP/GM/MPMN 18/05/2022
10	2475275	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - II ETAPA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	CERCADO	2,789,161.42	RGM N°169-2022-GM-A/MPMN 19/05/2022
11	2508295	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE FATIMA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	SAN FRANCISCO	74,932.18	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°176-2022-GM-A/MPMN 06/06/2022

3. EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
12	2508644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	SAN FRANCISCO	13,164,729.36	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°191-2022-GM-A/MPMN 14/06/2022
13	2302137	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	TRANSPORTE	P.J. MARISCAL NIETO	2,646,281.88	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°200-2022-GM-A/MPMN 21/06/2022
14	2508687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA MANZANA L-006 DE LA ASOCIACIÓN CUA-1, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	CULTURA Y DEPORTE	SAN ANTONIO	4,268,849.45	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°171-2022-GM-A/MPMN 24/05/2022
15	2508659	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN VILLA DE SAN ANTONIO DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	CULTURA Y DEPORTE	SAN ANTONIO	3,805,986.41	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°179-2022-GM-A/MPMN 09/06/2022
16	2508653	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN LA FLORESTA DE LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	CULTURA Y DEPORTE	SAN ANTONIO	3,357,974.95	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°199-2022-GM-A/MPMN 21/06/2022



3. EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS 2022

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
17	2498007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTION TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	MOQUEGUA	6,797,104.09	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°243-2022-GM-A/MPMN 27/07/2022
18	2525779	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CÍVICA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	CHEN CHEN	5,961,994.58	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°194-2022-GM-A/MPMN 17/06/2022
TOTAL						84,248,327.77	

Logros:

18 EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS

4. EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN

N°	COD UNICO	PROYECTO	MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO S/.	SECTOR	UBICACIÓN	ESTADO SITUACIONAL	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	2511460	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,201,748.47	CULTURA Y DEPORTE	SOMOA	EN ELABORACION	100%	TRAMITE DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
2	2505476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,987,704.33	CULTURA Y DEPORTE	P.J. MARISCAL NIETO	EN ELABORACION	98%	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR OSLO
3	2508297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL PERU - APEMIPE- DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,687,119.13	TRANSPORTE	CHEN CHEN	EN ELABORACION	98%	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR OSLO
4	2517201	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,961.676.35	DEPORTE	SAN ANTONIO	EN ELABORACION	97%	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR OSLO
5	2192006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - EXPEDIENTE DE MODIFICACION POR ACTUALIZACION - TRAMO II	6,528,742.77	TRANSPORTE	LOS ANGELES / YACANGO	EN ELABORACION	75%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
6	2475277	RECUPERACION Y CIERRE DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL BOTADERO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO PAMPAS DEL CHEN CHEN SUR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	21,910,237.84	AMBIENTE	CHEN CHEN	EN ELABORACION	65%	DESARROLLO DE ESTUDIOS POR CONVENIO
7	2179366	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	3,217,929.00	CULTURA Y DEPORTE	CHEN CHEN	EN ELABORACION	45%	DESARROLLO DE ESTUDIOS



4. EXPEDIENTES TÉCNICOS EN ELABORACIÓN

N°	COD UNICO	PROYECTO	MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO S/.	SECTOR	UBICACIÓN	ESTADO SITUACIONAL	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
8	2389323	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA	7,118,792.52	EDUCACION	ALTO LA VILLA - LOS ANGELES	EN ELABORACION	45%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
9	2389340	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°275 EN EL SECTOR ESTUQUIÑA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,827,106.90	EDUCACIÓN	ESTUQUIÑA LOS ANGELES	EN ELABORACION	45%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
10	2508264	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS SECTORES AGRÍCOLAS DE TRAPICHE, YARAVICO, ALTILLO MONTALVO, SANTA ROSA CALALUNA, FUNDO QUEBRADA DE CALALUNA, CALALUNA, ALTILLO ALTO, LOCUMBILLA, ASOC. AGRÍCOLA DE SAN PEDRO Y CERRO COLORADO DEL VALLE DE MOQUEGUA, ASOC. LAS PIEDRITAS Y ASOC. 28 DE JULIO DEL C.P. SAN ANTONIO, QUEBRADA LAS LECHUZAS Y SECTOR DE RIEGO IV MÓDULO 17 Y 18 PERPG DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.	2,163,723.57	ELECTRIFICACION	SAN ANTONIO CHEN CHEN	EN ELABORACION	40%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
11	2539610	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN SANTA CATALINA DE LA JUNTA VECINAL SIMÓN BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,298,617.50	TRANSPORTE	CERCADO	EN ELABORACION	40%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
12	2372276	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL Cerro san bernabe DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,876,476.77	TURISMO	CERCADO	EN ELABORACION	45%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
13	2494038	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, OFICINA ADMINISTRATIVA, ALMACEN Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DE PREFABRICADOS ASFALTO Y AGREGADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	1,038,015.92	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	SAN ANTONIO	EN ELABORACION	45%	DESARROLLO DE ESTUDIOS
14	2475275	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - III ETAPA	2,789,161.42	TRANSPORTE	CERCADO	EN ELABORACION	20%	DESARROLLO DE ESTUDIOS



SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS OBRAS EN EJECUCIÓN

- PROGRAMAR, COORDINAR, DIRIGIR, EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS, CONFORME EL CRONOGRAMA DE PRIORIDADES EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE.



SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS EN EJECUCION 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

PIM 2022: S/. 148,835,415.12 Soles

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRESUPUESTO ASIGNADO PIM 2022 (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA(S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO ENERO - AGOSTO 2022(S/.)
1	OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 – 2022	14	88,005,898.00	96,370,566.69	67,405,457.97
2	OBRAS INICIADAS 2022	12	60,829,517.12	40,699,596.18	40,383,553.08
3	OBRAS POR INICIAR	2		-	-
	TOTAL	28	148,835,415.12	137,070,162.87	107,789,011.05

EJECUCIÓN 2022 S/. 107,789,011.05 SOLES

28

72.42 %

14 OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 – 2022
12 OBRAS INICIADAS
02 OBRAS POR INICIAR





1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2509884 - "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN: S/. 4'619,417.91 SOLES

PIM 2022: S/. 3'221,241.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	60.52 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	2,233,169.44

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
21/10/2021	30/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE PISTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 2", CONSTRUCCION DE VEREDA, MARTILLOS, GRADERIA, RAMPA, SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2, MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO SIMPLE ARMADO F'C=210 KG/CM2, IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TRAFICO E IMPLEMENTACION DE PARADERO URBANO.



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2491162 - IOARR: "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACIÓN DE COBERTURA; RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA".

INVERSIÓN: S/. 3,610,624.20 SOLES

PIM 2022: S/. 2,895,480.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	36.34 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	1,939,226.45

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
08/11/2021	22/10/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: - Acondicionamiento y mejoramiento del área para perifoneo con confección y montaje de cobertura metálica para protección. - Mejoramiento de la prestación de los servicios higiénicos y puesta en servicio y automatización de equipos mecánicos. - Sustitución y/o reposición de todos aquellos equipos y/o accesorios electrónicos que hayan agotado su vida útil o sufrido daño por diversas causas. - Recuperación del servicio de Videovigilancia y Comunicación.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2508298 - CREACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.

INVERSIÓN – ETAPA I: S/. 10,785,490.67 SOLES

INVERSIÓN – ETAPA II: S/. 3,969,458.11 SOLES

PIM 2021: S/. 2,015,292.00 SOLES

PIM 2022: S/. 12,310,178.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	62.63 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	8,351,543.47

ETAPA	INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN
I	03/11/2021	24/09/2022
II	18/05/2022	14/10/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: RED DE DRENAJE PLUVIAL URBANO PRIMARIO Y SECUNDARIO, BUZONES DE VISITA PLUVIAL, SUMIDEROS Y CAJAS DE REGISTRO Y ESTRUCTURA DE DESCARGA.



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2149655 - MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 6,190,881.95 SOLES

PIM 2022: S/. 443,241.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	98.38 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	5,947,746.53

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
15/05/2017	30/06/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO CONSISTE EN LAS ADECUADAS CONDICIONES TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA,
- EN ESTA ULTIMA ETAPA SE EJECUTO LA META FISICA “CONFECCIÓN E INSTALACION DE BARANDAS METÁLICAS, EMPLEADO MATERIAL TUBO DE ACERO Fº Nº 2” E=2,5 MM, TUBO DE ACERO Fº Nº 1 ½” E=2,00 MM, HACIENDO UN TOTAL DE 695 M. DE BARANDAS METALICAS INSTALADAS”.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2372303 – “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERIA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”.

INVERSIÓN: S/. 10,335,794.86 SOLES

PIM 2022: S/. 8,241,683.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	50.00 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	6,391,159.88

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
21/10/2021	30/11/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA:

- CONSTRUCCION DE PISTAS Y BERMAS (IMPRIMADAS A NIVEL DE BASE),
- CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO CON ACABADO SUPERFICIAL DE GRAVILLA Y CEMENTO FROTACHADO
- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION.

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2181926 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 8,282,591.29 SOLES

PIM 2022: S/. 6,657,960.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	51.75 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	5,924,919.16

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
15/11/2021	07/10/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: LA EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON SLURYY SEAL), TRATAMIENTO DE VEREDAS, GRADERIAS Y MUROS DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, RECURSOS PARA ACCIONES CONTRA COVID-19



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir




1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2245034 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 11,713,787.58 SOLES

PIM 2022: S/. 9,666,609.00 SOLES

ANTES

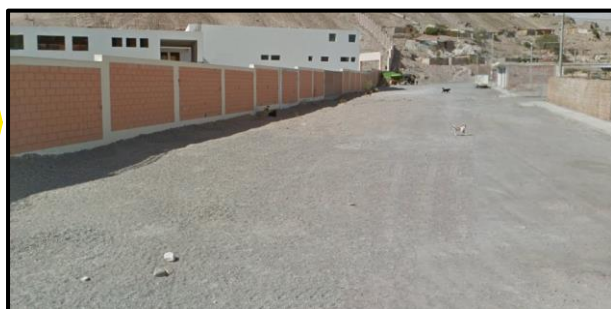

PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	44.49 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	7,446,541.69

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
21/10/2021	07/10/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y BERMAS, CONSTRUCCION DE GRADERIAS, MUROS Y VEREDAS



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2083865 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 34,100,375.33 SOLES

PIM 2022: S/. 18,758,980.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	53.77 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	25,148,663.32

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
03/08/2020	30/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS , PLANTA DE BENEFICIO PRODUCCIÓN, INCINERACIÓN, NECROPSIA, SUB ESTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE CISTERNA, CASETA DE BOMBEO, CORRALES DE AISLAMIENTO, CORRALES DE DESCANSO (OVINO, PORCINO, BOVINO). EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2151159 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL-PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES EN LA JUNTA VECINAL EL SIGLO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 3,492,039.80 SOLES

PIM 2022: S/. 1,976,170.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	80.00 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	3,224,278.67

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
01/09/2021	20/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

CULMINACION DE EJCUCIONDE VEREDAS (CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE MIRAFLORES, CALLE ANCASH, CALLE GARIBALDI, CALLE LIBERTAD, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES Y PASAJE A), SARDINELES (CALLE SAN JUAN DE DIOS, PASAJE A, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES Y CALLE MIRAFLORES) Y MUROS DE CONTENCION (CALLE SAN JUAN DE DIOS, PASAJE A, CALLE LIBERTAD, CALLE MIRAFLORES, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES) PISTAS PAVIMENTO RIGIDO ... (CALLE LIBERTAD Y PASAJE A) , PISTAS PAVIMENTO FLEXIBLE (IMPRIMACION CALLE SAN JUAN DE DIOS).



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir



1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2434761 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 2'957,299.02 SOLES

PIM 2022: S/. 2,604,599.00 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	37.61 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	1,804,684.15

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
06/12/2021	30/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE RODADURA, CUNETAS COMO CALZADA, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y SARDINELES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DRENAJE Y DE RIEGO.



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2518513- ADQUISICION Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS Y LUMINARIAS, REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL (LA) ESPACIOS PUBLICOS (ZONA EL GALLITO Y FUNDO EL GRAMADAL) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 2,412.141.25 SOLES

PIM 2022: S/. 2,263,432.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	76.49 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	1,678,093.74

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
14/02/2020	04/11/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: ESCULTURAS DE MADERA DICUS, AREAS VERDES, ILUMINACION, MEJORAMIENTO DEL PARQUE, PEDESTALES DE PIEDRA GRANODIORITA, MEJORAMIENTO DE PERBOLA Y BANCAS.



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**



1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2475359 – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”


INVERSIÓN: S/. 12,023,669.12 SOLES

PIM 2022: S/. 10,610,080.00 SOLES

ANTES



PROCESO

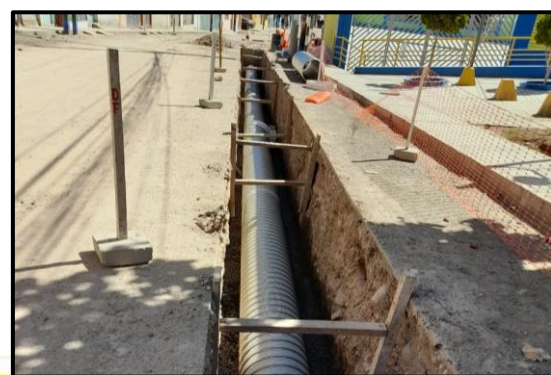

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	53.20%

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	6,586,068.75

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
21/10/2021	23/11/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS



METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE, BUZONES, LINEA SECUNDARIA DE DRENAJE, CANALETAS, POZA DE DISIPACION, REPOSICION DE PAVIMENTO, ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA, EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS Y PLAN DE INVERSION AMBIENTAL



1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022

CUI: 2486282 - REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) EN LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJÉRCITO, AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. CIRCUNVALACIÓN Y AV LA PAZ DEL CERCAO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 19,824,276.50 SOLES

PIM 2022: S/. 5,223,878.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	85.78 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	17,598,706.88

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
16/11/2020	18/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- REPARACIÓN TIPO 1: DEMOLICIÓN 2" – REASFALTADO 3"
- REPARACIÓN TIPO 2: DEMOLICIÓN 2" – REASFALTADO 2"
- REPARACIÓN TIPO 3: FRESADO 1" – REASFALTADO 2"
- REPARACIÓN TIPO 4: FRESADO 1.5" - REASFALTADO 1.5"
- REPARACIÓN TIPO 5: LOSAS DE CONCRETO
- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, TRATAMIENTO DE BERMAS
- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

1. OBRAS POR CONTINUIDAD 2021 - 2022




Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2513785 - CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 2,426,959.85 SOLES

PIM 2022: S/. 1,117,075.00 SOLES

ANTES

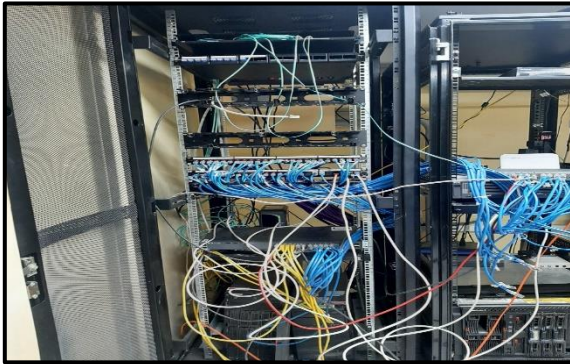

PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	91.29 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	2,095,764.56

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
05/07/2021	30/09/2022



15 x
mes

PUESTOS DE TRABAJO



800 PERS.

BENEFICIARIOS

**METAS FISICAS
EJECUTADAS**

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE RAMPA Y ADECUACION DE AMBIENTES DE LA MPMN, EL EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN FIBRA OPTICA Y CABLE DE COBRE, EL MEJORAMIENTO DE LA RED LAN Y SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA MPMN Y EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA MPMN.



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2486345 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y DISTRITO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 19,564,957.84 SOLES

PIM 2022: S/. 16,274,233.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	14.76 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	5,527,410.59

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
07/02/2022	01/02/2023



PUESTOS DE TRABAJO

Pobladores del CP. San Francisco y Distrito San Antonio



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS
- COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL: INSTALACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
- COMPONENTE DE SEÑALIZACION: DUCTERIA PARA FIBRA ÓPTICA



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2518938 OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN: S/. 3'878,026.22 SOLES

PIM 2022: S/. 3'358,710.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	6.61 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	164,595.94

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
25/07/2022	21/12/2022



35 x
Mes

PUESTOS DE TRABAJO



40,239 PERS

BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- CONSTRUCCION DE PISTA: REASFALTADO DE VÍAS Y BERMAS, PLAN DE CONTINGENCIAS Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO.
- CONSTRUCCIÓN DE BERMAS.
- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
- CONSTRUCCION DE VEREDA



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI 2475275: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA." – ETAPA II

INVERSIÓN: S/. 2'789,161.42 SOLES

PIM 2022: S/. 2'558,151.00 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	13.60 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	478,830.96

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
14/06/2022	10/12/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS ADOQUINADO: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, SE PUEDE OBSERVAR EL AVANCE EN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO, DEMOLICIÓN DE VEREDAS, CONFORMACION DE BASE TIPO SUELO CEMENTO, PARA LA COLOCACIÓN DEL ADOQUINADO.



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2213852 “MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”.

INVERSIÓN: S/. 2'885,873.12 SOLES

PIM 2022: S/. 1,897,170.79 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	44.18 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	1'377,358.94

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
18/02/2022	14/12/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS
- CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES
- CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS
- CONSTRUCCION DE PORTICO PRINCIPAL DE INGRESO



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2180790 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA FRANCISCO FAHLMAN, NUEVA TEXAS, Y VILLA 4 DE NOVIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 1'703,336.33 SOLES

PIM 2022: S/. 1,703,336.33 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	40.55 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	849,638.41

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
07/06/2022	03/11/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- SISTEMA DE AGUA POTABLE: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA 851.90 ML DE INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC, ACCESORIOS, VÁLVULAS, GRIFOS CONTRA INCENDIO Y 97 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA.
- SISTEMA DE ALCANTARILLADO: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA 903.18 ML DE INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC, CONSTRUCCIÓN DE 20 BUZONES DE CONCRETO Y 97 CONEXIONES DOMICILIARIAS.



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2527361 "REUBICACION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) DE LA CALLE TACNA (ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA".

INVERSIÓN: S/. 597,157.97 SOLES

PIM 2022: S/. 620,243.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	100.00 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	528,454.29

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
16/02/2022	21/05/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS LA CUAL SE PROCEDERÁ A HABILITAR EL ESPACIO PARA LA REUBICACIÓN DE LOS AMBIENTES DE EXPENDIO DE COMIDA, EL CUAL FORMARÁ PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS COMERCIANTES QUE UTILIZARÁN, LOS AMBIENTES HABILITADOS ESTARÁN DENTRO DE LA FERIA CARRILLO.



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2192006 «MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES – CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA», TRAMO I (PROG. 0+000 – 3+580)

INVERSIÓN: S/. 7'503,407.87 SOLES

PIM 2022: S/. 7'651,448.00 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	12.57 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	1'229,996.41

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
23/05/2022	21/11/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN DE LA BASE Y SUB BASE, ASI COMO EL PERFILADO Y COMPACTADO EN LA ZONA DE CORTE
- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS.



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2475159 - "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN: S/. 5'485,803.67 SOLES

PIM 2022: S/. 5'139,303.00 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	23.67 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	3,272,510.12

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
16/03/2022	11/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARARRAYOS, MASTIL, MATERIALES DE PUESTA A TIERRA Y EL MONTAJE ELECTROMECHANICO EN LAS 16 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARUMAS: ATASPAYA, CARUMAS, CAMBRUNE, SOMOA, SAILAPA, HUMAJALSO, CHILOTA, HUACHUNTA, ARUNTAYA, PASTO GRANDE, CHACAPUNCO, PASTO GRANDE, WILLACOLLO, CACACHARA, ACHACALA, PAMPA PUTINA, AGUAS TERMALES, CHILIGUA.



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2053446 MEJORAMIENTO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ÁNGELES Y LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 8'994,128.19 SOLES

PIM 2022: S/. 7,926,104.00 SOLES

ANTES



PROCESO

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	38.58 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	3,905,040.78

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
07/02/2022	04/10/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CON DISEÑO , MARTILLOS ,RAMPAS Y JARDINERAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES.
- PISTAS: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO URBANO (FLEXIBLE Y RÍGIDO).



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2447248 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTÓBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN: S/. 24,878,798 SOLES

PIM 2022: S/. 7,929,986 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	4.02% %
	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	2,119,1338.00

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
02/06/2022	07/05/2023



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- Corte en material suelto 15,839.79 m³
- Eliminación de material excedente D>1 KM 20,591.72 m³
- Construcción de 69.85 m³ concreto muros de gravedad f'c=140kg/cm²
- Limpieza y descolmatación de cause de rio = 1,608.34 m²
- Desvío de rio = 242 m



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**




2. OBRAS INICIADAS 2022

CUI: 2520332 – MEJORMAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

INVERSIÓN: S/. 2,793,390.95 SOLES

PIM 2022: S/. 2,985,699.00 SOLES

ANTES

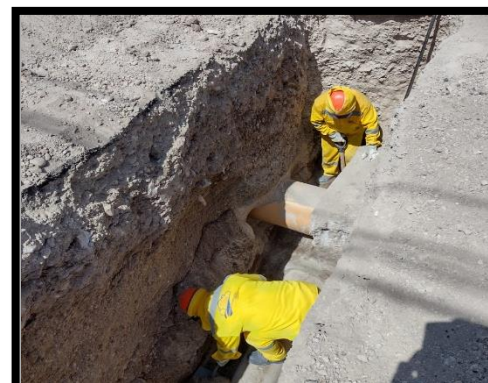

PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	65.92 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	2,038,165.14

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
21/02/2022	30/09/2022



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

INSTALACION DE 2,931.92 METROS DE TUBERIA (PVC UF DN=200MM+3% DESPERDICIO ISO 4435 S-20) - INSTALACION DE 859.00 METROS DE TUBERIA (PVC UF DN=250MM+3% DESPERDICIO ISO 4435 S-20) - INSTALACION DE 926.27 METROS DE TUBERIA (PVC UF DN=300MM+3% DESPERDICIO ISO 4435 S-20) - 78 UND DE BUZNES DE DESAGUE - 3,132.40 METROS DE TUBERIA PVC UF DN 160MM +3% DESPERDICION ISO 4435-S-20) - 460 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS



MOQUEGUA

el mejor lugar para **vivir**

2. OBRAS INICIADAS 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2525779 "CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CÍVICA DEL CENTRO POBLADO CHENCHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".

INVERSIÓN: S/. 5,961,994.58 SOLES

PIM 2022: S/. 2,785,133.00 SOLES

ANTES



PROCESO



	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FISICO	9.04 %

	ACUMULADO HASTA AGOSTO 2022
AVANCE FINANCIERO	136,256.60

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
11/08/2022	07/02/2023



PUESTOS DE TRABAJO



BENEFICIARIOS

METAS FISICAS EJECUTADAS

- COMPONENTE I: CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

3. OBRAS POR INICIAR 2022




Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2508295 - "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE FÁTIMA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

INVERSIÓN: S/. 767,307.03 SOLES

ANTES

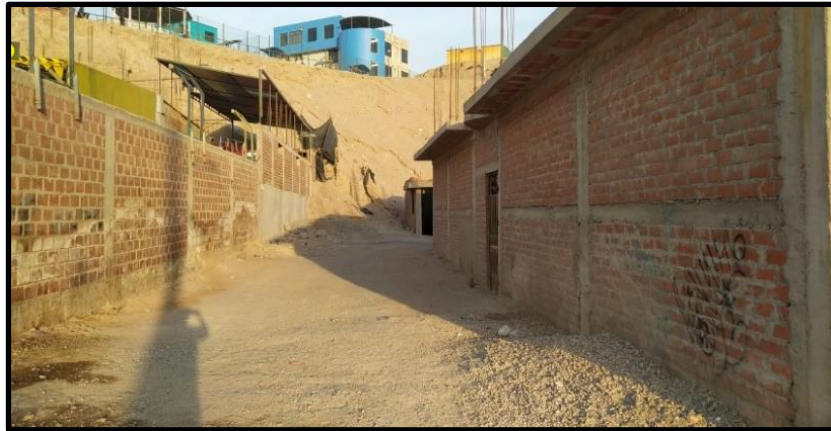

METAS FISICAS PROGRAMADAS

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCION DE PISTA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRIO, CONSTRUCCION DE VEREDAS, RAMPAS Y GRADAS, REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICAS POR INTERVENCION

INICIO DE OBRA PROGRAMADO	FECHA DE CULMINACION
07/09/2021	20/11/2022



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

3. OBRAS POR INICIAR 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CUI: 2508644 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA IV DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

INVERSIÓN: S/. 13'088,696.28 SOLES

PIM 2022: S/. 3,949,635.00 SOLES

ANTES



METAS FISICAS PROGRAMADAS

- CONSTRUCCIÓN DE PISTAS: ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL PROYECTO, ABARCA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO URBANO (FLEXIBLE CON ASFALTO EN CALIENTE Y RÍGIDO).
- CONSTRUCCION DE VEREDAS.
- CONSTRUCCIÓN DE BERMAS.
- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN

INICIO DE OBRA	FECHA DE CULMINACION
05/09/2022	01/07/2023



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



GRACIAS...



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



COORDINACIÓN DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 2022





PRESUPUESTO 2022

PIM 2022: S/. 20,786,975.95 Soles



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

DESCRIPCION	PIM ASIGNADO 2022	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO
ACTIVIDADES EN EJECUCION	2,588,163.95	1,721,448.37	727,093.85	866,715.58
ACTIVIDADES EN PRE-EJECUCION	1,610,603.55	124,595.70	3,110.70	1,486,007.85
ACTIVIDADES CULMINADAS	10,036,962.45	8,437,992.35	8,176,419.00	1,598,970.10
PLAN DE TRABAJO 2022	495,500.00	406,558.59	347,537.09	88,941.41
ACTIVIDADES TRANSFERIDAS	6,034,876.00	4,302,003.76	3,729,424.93	1,732,872.24
RECONOCIMIENTO DE DEUDA	20,870.00	20,860.50	20,860.50	9.50
TOTALES	20,786,975.95	15,013,459.27	13,004,446.07	5,773,516.68

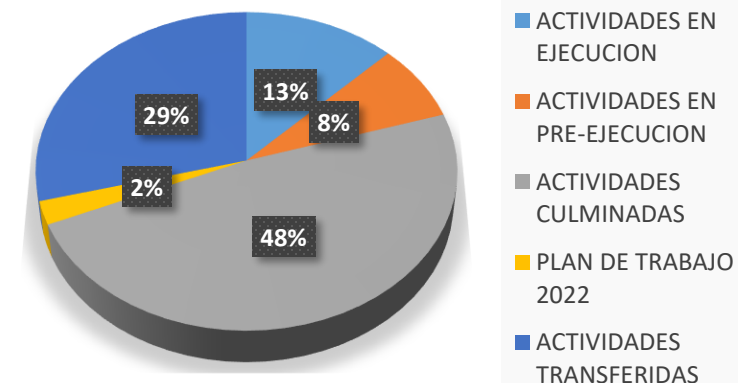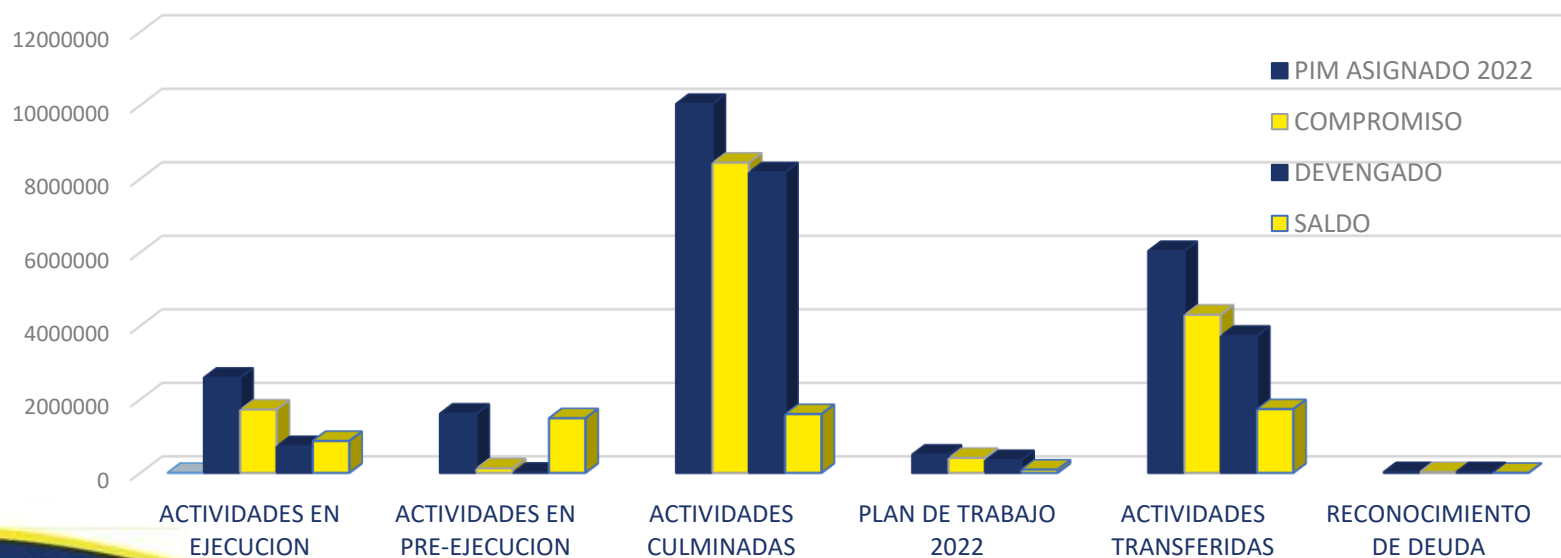

MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir




ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SECTOR

05
21

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

ACTIVIDADES CULMINADAS

PTTO. ASIGNADO

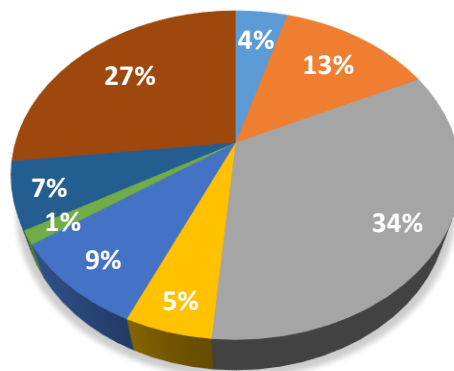

- PLAN DE TRABAJO
- CAMINO RURAL
- INFRAESTRUCTURA
- SALUBRIDAD
- CANALES
- MAQUINARIA
- PARQUE Y AREAS VERDES
- VIAL

MONTO APROBADO:
S/14,035,653.46

EJECUCION 2022 (ENERO-AGOSTO)

SECTORES	PTTO. ASIGNADO	CANTIDAD
PLAN DE TRABAJO	S/ 631,023.70	1
CAMINO RURAL	S/ 1,873,184.54	5
INFRAESTRUCTURA	S/ 4,709,968.04	9
SALUBRIDAD	S/ 734,142.39	1
CANALES	S/ 1,216,248.45	2
MAQUINARIA	S/ 188,669.93	1
PARQUE Y AREAS VERDES	S/ 918,039.15	2
VIAL	S/ 3,764,377.26	6
TOTAL DE PPTO EJECUTADO	S/ 14,035,653.46	27



1400
PUESTO DE TRABAJO



1100

PUESTO DE TRABAJO
SOLO MUJERES

90% MUJERES



**RELACIÓN DE FICHAS DE
MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN – PRE
EJECUCIÓN – CULMINADOS DE ENERO –
AGOSTO DEL 2022**



ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
1	EJECUCIÓN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE - TRIBUNA SUR Y ORIENTE, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.	175	ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE	SALUBRIDAD	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°029-2022-GIP/GM/MPMN (26/01/2022)	S/ 734,142.39	60	S/ 173,568.27	29%	S/ 102,461.03	13.96%
2	EJECUCIÓN	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVO DANIEL BECERRA OCAMPO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	274	DISTRITO DE MOQUEGUA	INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°098-2022-GIP/GM/MPMN (28/04/2022)	S/ 517,311.19	75	S/ 134,042.38	32%	S/ 142,501.66	27.55%
3	EJECUCIÓN	"MANTENIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL MEDIANTE PARCHADOS EN CARPETA ALFALTICA, SELLADO DE FISURAS Y OTROS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	280	CP. LOS ANGELES Y CP. SAN FRANCISCO	VIAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°134-2022-GIP/GM/MPMN (08/06/2022)	S/ 839,115.26	90	S/ 91,425.15	14%	S/ 16,732.20	1.99%
4	EJECUCIÓN	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA TRANSITABILIDAD DE VÍAS MEDIANTE PARCHADOS EN CARPETA ALFALTICA, PAVIMENTO RÍGIDO Y OTROS EN EL A.A.H.H. MARISCAL NIETO, P.J. EL SIGLO Y EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	281	DISTRITO DE MOQUEGUA	VIAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°133-2022-GIP/GM/MPMN (08/06/2022)	S/ 972,010.29	90				
5	EJECUCIÓN	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS COBERTURAS DE LOS PATIOS DE LA I.E. SANTA FORTUNATA, DEL DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	291	DISTRITO DE SAMEGUA	INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°157-2022-GIP/GM/MPMN (11/07/2022)	S/ 280,768.21	30	S/ 172,832.16	77%	S/ 203,016.32	72%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



ACTIVIDADES EN PRE EJECUCIÓN



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Nº	ACTIVIDADES	META 2022	PRESUPUESTO DE FICHA SEGÚN RESOLUCION	TIEMPO DE EJECUCION	RESOLUCION DE APROBACION
1	MANTENIMIENTO PARA LA ADECUADA ACCESIBILIDAD EN VÍAS MEDIANTE PARCHADOS Y SELLADO DE FISURAS EN CARPETA ASFALTICA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	288	371,378.11	60	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N° 110-2022-GIP/GM/MPMN
2	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA AV N° 01, CALLE 2 Y CALLE 4 Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VIAS ALEDAÑAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	290	686,401.90	30	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N° 151-2022-GIP/GM/MPMN
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN PLUVIAL EN LAS COBERTURAS SOBRE LOS PUESTOS Y PASADIZOS DE LOS BLOQUES COLINDANTES A LA CALLE AMAZONAS - LADO NOR ESTE, DEL CENTRO FERIAL SANTA FORTUNATA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	300	767,343.60	60	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N° 68 -2022-GIP/GM/MPMN

MONTO APROBADO:

S/1,610,603.55



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir

ACTIVIDADES CULMINADAS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
1	CULMINADA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINARIA PESADA DE LA UOSME DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	148	UOSME	MAQUINARIA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°192-2021-GIP/GM/MPMN (10/11/2021)	S/ 188,669.93	60	S/ 122,016.27	79%	S/ 1,846,677.60	98%
2	CULMINADA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AREAS COMUNES DE USO PUBLICO E INFRAESTRUCTURAS ACTUALES DE 09 PARQUES, 18 LOSAS Y VIAS PRINCIPALES PARA EL ADECUADO SERVICIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	164	DISTRITO DE SAN ANTONIO	PARQUES Y AREAS VERDES	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°005-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 552,251.32	60	S/ 417,087.81	93%	S/ 517,496.79	94%
3	CULMINADA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS EN LOS COMEDORES POPULARES HIJAS DE SION, FRANCISCO FALHMAN Y DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, Y DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	158		INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°017-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 339,872.32	60	S/ 272,491.89	99.82%	S/ 305,285.34	89.82%
4	CULMINADA	MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO MEDIANTE LIMPIEZA DE POLVILLO EN VÍAS, PINTADO Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCION, BARANDAS, GRADERIAS Y OTROS DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	160		INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°010-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 552,501.77	60	S/ 360,380.50	79%	S/ 412,035.37	75%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



ACTIVIDADES CULMINADAS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
5	CULMINADA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA, ÁREAS VERDES DEL C.P. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA	157	CP. SAN FRANCISCO	PARQUES Y AREAS VERDES	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°011-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 365,787.83	60	S/ 277,851.99	95%	S/ 334,262.05	91%
6	CULMINADA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE REPARACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS, GRADERIAS, PINTADO DE MURALES Y LIMPIEZA DE CALZADAS, BERMAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL C.P. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA	162		INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°008-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 658,567.10	60	S/ 508,674.35	94%	S/ 453,384.38	69%
7	CULMINADA	“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, CALLEJONES Y CAMINOS RURALES DE LAS COMISIONES DE RIEGO: EL RAYO, CHARSAQUA, ESCAPALAUQUE, ESTUQUIÑA Y DEMÁS SECTORES, DEL C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”	151	CP. LOS ANGELES	CAMINO RURAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°015-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 520,100.43	60	S/ 389,754.65	91%	S/ 453,269.79	87%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



ACTIVIDADES CULMINADAS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
8	CULMINADA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE REPARACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS, PINTADO DE MURALES Y LIMPIEZA DE CALZADAS, BERMAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL CP DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	156	CP. CHEN CHEN	VIAS	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°012-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 487,351.67	60	S/ 383,000.79	96%	S/ 308,517.33	63%
9	CULMINADA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y ÁREAS VERDES Y PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	152		INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°018-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 683,250.36	60	S/ 516,929.06	92%	S/ 537,235.87	79%
10	CULMINADA	MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL CLUB DE MADRES CHEN CHEN Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN MUROS DE CONTENCIÓN, BARANDAS, GRADERIAS Y PARQUES DEL AA.HH. MARISCAL NIETO, AA.HH. EL SIGLO Y EL CERCADO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	159	MOQUEGUA	INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°009-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 503,894.01	60	S/ 405,963.83	99%	S/ 419,574.82	83%
11	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CALLEJONES, CAMINOS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LAS JUNTAS VECINALES: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	150	VALLE DE MOQUEGUA	CANALES	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°003-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 735,783.18	60	S/ 535,135.37	89%	S/ 563,868.11	77%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



ACTIVIDADES CULMINADAS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
12	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANALES Y ACEQUIAS, Y LIMPIEZA DE CALLEJONES Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	163	DISTRITO DE SAMEGUA	CAMINO RURAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°013-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 350,188.45	60	S/ 261,116.94	93%	S/ 263,002.23	75%
13	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN CANALES Y/O ACEQUIAS Y ADECUACION DE CALLEJONES Y CAMINOS DE SECTORES DE 12 QUEBRADAS, LOS CARIBEÑOS, NUEVA ESPERANZA, COPLAY, ALEGOMA Y EL C.P. DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	161	CP. YACANGO	CANALES	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°016-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 480,465.27	60	S/ 381,608.25	99%	S/ 405,429.24	84%
14	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 08 CLUBES DE MADRES Y ASOCIACIONES DE LOS DISTRITO DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y CALACOA - SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA",	153	DISTRITO DE CARUMAS	INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°019-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 592,428.27	60	S/ 453,355.98	95%	S/ 552,744.19	93%
15	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS DE HERRADURA DEL DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	155		CAMINO RURAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°004-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 342,825.36	60	S/ 266,261.55	96%	S/ 232,240.22	68%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



ACTIVIDADES CULMINADAS



Municipalidad Provincial

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
16	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS DE HERRADURA DE LAS LOCALIDADES DE CUCHUMBAYA, SACUAYA, SOQUESANE, QUEBAYA, HUATALAQUE Y YOJO DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	149	DISTRITO DE CUCHUMBAYA	CAMINO RURAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°007-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 328,698.39	60	S/ 260,894.83	98%	S/ 265,116.25	81%
17	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS DE HERRADURA DEL CP DE MUYLAQUE, CALACOA – BELLAVISTA Y CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE SIJUAYA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – CALACOA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"	154	DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	CAMINO RURAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°006-2022-GIP/GM/MPMN (07/01/2022)	S/ 331,371.91	60	S/ 260,069.16	97%	S/ 289,401.03	87%
18	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DE VELOCIDAD MEDIANTE PINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y OTROS, EN CALLES ALEDAÑAS DE 12 COLEGIOS Y VÍAS PRINCIPALES DE LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	209	DISTRITO DE MOQUEGUA - SAN ANTONIO	VIAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°050-2022-GIP/GM/MPMN (03/03/2022)	S/ 544,132.32	60	S/ 289,524.82	66%	S/ 413,704.71	76%
19	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY SEAL, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS CALLES PROLONGACION TACNA, AV. 1 Y AV. COLONIAL DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA"	253	CP. CHEN CHEN	VIAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°028-2022-GIP/GM/MPMN (20/01/2022)	S/ 566,358.80	45	S/ 462,333.71	100%	S/ 424,958.18	75%
20	CULMINADA	"MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CALLE TUMBES, CALLE VALLECITO, CALLE DOS DE MAYO, DEL C.P. SAN FRANCISCO - DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".	254	DISTRITO DE MOQUEGUA	VIAL	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°027-2022-GIP/GM/MPMN (20/01/2022)	S/ 355,408.92	45	S/ 276,732.90	97%	S/ 318,588.75	91%
21	CULMINADA	"MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 43014 ÁNGELA BARRIOS DE ESPINOZA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".	216	DISTRITO DE MOQUEGUA	INFRAESTRUCTURA	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°065-2022-GIP/GM/MPMN (24/03/2022)	S/ 581,374.81	75	S/ 463,868.83	99%	S/ 491,998.14	85%



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

MONTO APROBADO:
S/14,035,653.46

ACTIVIDADES TRANSFERIDAS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

**TRANSFERIDO A LA GERENCIA
DE SERVICIOS A LA CIUDAD**

ITEM	ACTIVIDAD	META	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN DE APROBACION
1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PUBLICAS MEDIANTE LA LIMPIEZA DE VÍAS, REPARACIÓN Y PINTADO DE SARDINELES DEL CERCADO, PJ EL SIGLO, AA.HH. MARISCAL NIETO Y VÍAS PRINCIPALES DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	192	S/. 1,889,120.00	365	RESOLUCIÓN N° 031-2022 31 ENERO 2022
2	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	195	S/. 2,083,507.19	365	RESOLUCIÓN N° 032-2022 02 FEBRERO 2022
3	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN DE 09 AREAS RECREATIVAS, JARDINERAS Y SARDINELES DE 12 PRINCIPALES AVENIDAS DEL CP. DE CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- MARISCAL NIETO- MOQUEGUA	198	S/. 1,350,597.89	365	RESOLUCIÓN N° 038-2022 11 FEBRERO 2022
4	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL BOTADERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	217	S/. 827,026.55	90	RESOLUCIÓN N° 055-2022 14 MARZO 2022

TOTAL:
S/. 6,150,251.63




MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

DIST. SAN ANTONIO

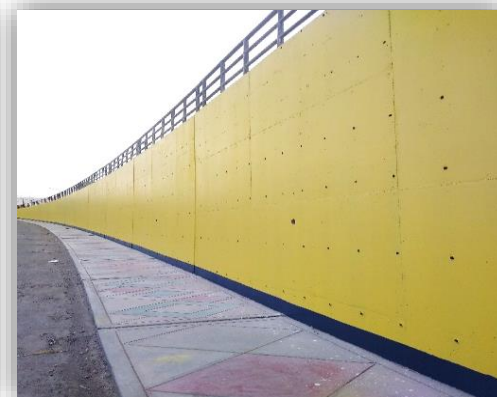

ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

**DISTRITO DE MOQUEGUA
(CERCADO)**



ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

DIST. SAMEGUA



ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIETOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

DIST. CARUMAS



ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CP. SAN FRANCISCO



ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**


22 de marzo de 2022 3:14 p.m.

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CP. CHEN CHEN



ANTES

DESPUES

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CP. LOS ANGELES



ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CP. YACANGO



ANTES



DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS

VALLE



ANTES

DESPUES




PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

**CERCADO - SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL**

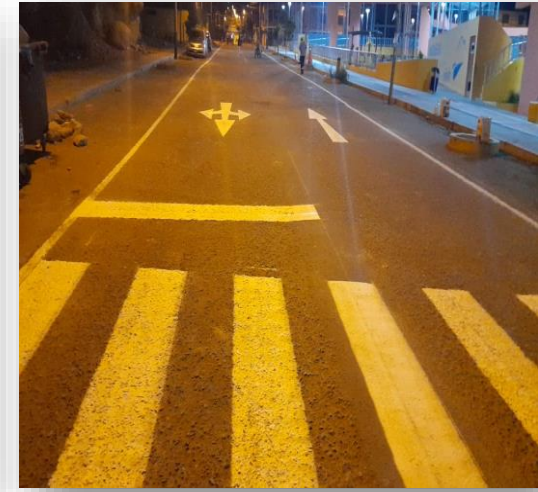

ANTES

DESPUES




MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

VIAS - CP. CHEN CHEN

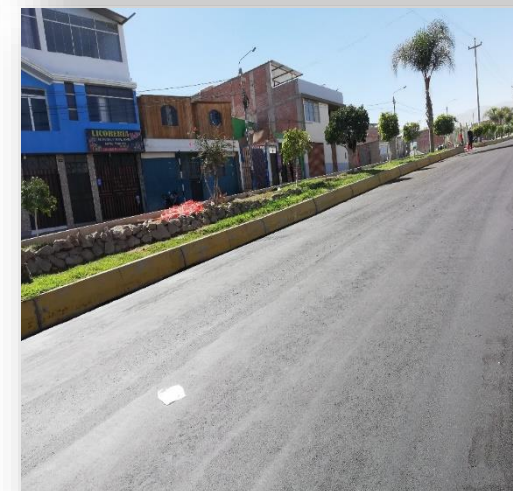

ANTES

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CP. SAN FRANCISCO - VIAS



ANTES

DESPUES





MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

CERCADO

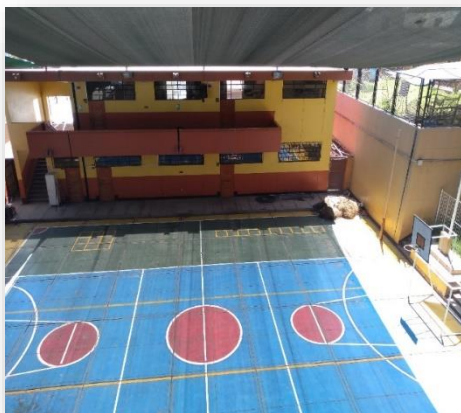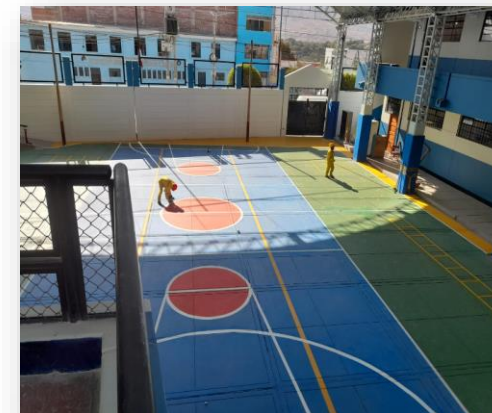

ANTES

DESPUES




MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**


PANEL FOTOGRAFICO DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

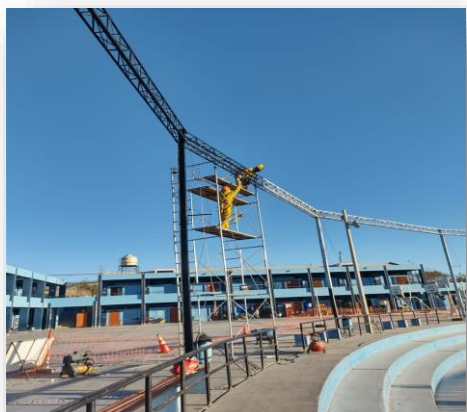

ANTES

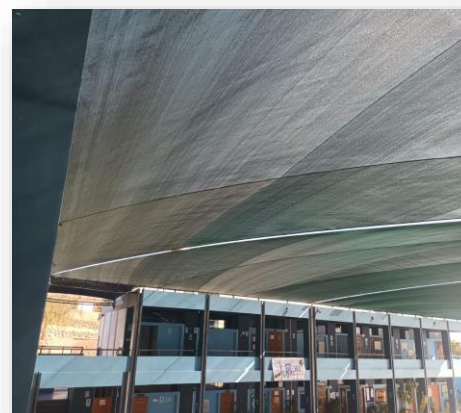

DESPUES



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

LOGROS OBTENIDOS EN EL 2022 (ENERO –AGOSTO)



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

- GERENRACION DE **1,400 PUESTOS DE TRABAJO** EN LAS 26 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DURANTE EL PERIODO **ENERO - AGOSTO EXCLUSIVO PARA LA PROVINCIA MARISCAL NIETO.**
- Con 21 actividades de Mantenimiento; se ha generado **1100 PUESTOS DE TRABAJO** para las Mujeres de la **PROVINCIA MARISCAL NIETO.**
- CEEFM PROMOVIO LA GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA POBLACION MAS NECESITADA, SIENDO MUJERES MAS DEL 90 % DEL PERSONAL OBRERO, MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
- EN LAS DIFERENTES LINEAS DE ACCION DEL CEEFM SE HA CUMPLIDO CON EL GASTO PREVISTO ASIGNADO PARA EL **PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2022.**
- Se promovi6 la contratacion de proveedores locales, asi seguir activando la economia en la Region de Moquegua.

DIFICULTADES

- SE TUVO PROBLEMAS EN LA CONTRATACION DE MANO CALIFICADA DE ACUERDO A LA ESCALA DE PAGO ESTABLECIDO YA QUE EL PAGO BRUTO ES MUY INFERIOR AL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL.
- SE TUVO PROBLEMAS EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ES UN ORGANO DE APOYO QUE DEPENDE DE GERENCIA MUNICIPAL, ENCARGADA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS , OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA , ASI COMO LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



SUPERVISIÓN DE OBRAS

MODALIDAD EJECUCION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CANTIDAD (UND)	TOTAL (UND)	GASTO EN INSPECCIÓN S/.
ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INSPECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	32	36	S/. 1,947,617.99
		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4		
	INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	29	35	
		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1		
		GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	5		





SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS

UNIDAD FORMULADORA	ACTIVIDAD	CANTIDAD	GASTO EN INSPECCIÓN DE ESTUDIOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	REVISIÓN PLANES DE TRABAJO	33	S/ 173,747.02
	REVISIÓN EXPEDIENTES TECNICOS	31	
	REVISIÓN FICHAS DE MANTENIMIENTO	30	
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	REVISIÓN PLANES DE TRABAJO	07	
	REVISIÓN EXPEDIENTES TECNICOS	04	





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

OBRAS POR CONTRATA



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

❖ OBJETIVO

: Mejorar la calidad de vida y de la salud ambiental de los pobladores del distrito de Moquegua, a través de capacitaciones y concientización para que adquieran Buenas Prácticas Ambientales (BPA).

❖ MONTO CONTRACTUAL EJEC.+SUPERV.

: S/. 30, 086,430.89

❖ PRESUPUESTO ASIGNADO 2022

: S/. 738,418.00

❖ MONTO DE EJECUCION 2022

: S/. 184,370.15

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN

: 1069 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION

: Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA

: 55,546 beneficiarios

❖ ESTADO ACTUAL

: PROCESO DE LIQUIDACION

❖ FECHA DE INICIO

: 29/12/2018

❖ FECHA DE TERMINO

: 01/12/2021

❖ AVANCE FISICO

: 100 %



PUESTOS DE TRABAJO

83 max y 20 min x mes



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



CA
COMUNIDAD AMBIENTAL



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRÍCOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTÓBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA , CUI 2236084

❖ OBJETIVO

:Dotar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, que facilite el traslado de productos agrícolas entre los sectores Muylaque - china - empalme carretera san Cristóbal – Quinistaquillas que conlleven a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los centros poblados aludidos.

- ❖ PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC : S/. 25'687,22.84 Soles
- ❖ PRESUPUESTO ACTUALIZADO : S/. 26'697,338.18 Soles
- ❖ MONTO CONTRACTUAL EJEC. + SUPERV. : S/. 25'464,143.77 Soles
- ❖ MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO : S/. 24'663,957 Soles

- ❖ PRESUPUESTO ASIG. 2022 : S/. 3'991,822 Soles

- ❖ MONTO DE EJECUTADO AL MES DE AGOSTO : S/. 2,155,864 Soles

- ❖ PLAZO DE EJEC. : 1797 Días Calendarios
- ❖ MOD. DE EJECUCION : Administración Indirecta
- ❖ POBLACION BENEF. : 597 beneficiarios directos.
- ❖ ESTADO ACTUAL : EN EJECUCIÓN
- ❖ FECHA DE INICIO : 09/08/2017
- ❖ FECHA DE TERMINO : 13/09/2022
- ❖ AVANCE FISICO : 91.89 %
- ❖ AVANCE FINANCIERO : 92.40%
- ❖ EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS : 15 POR MES



31/5/2022 4:22:51
19K 317763 8153554
88° E
Altitud 2247.57
Velocidad 11.9km/h



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO – 518, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES – CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA

❖ OBJETIVO

: Mejorar las condiciones de transpirabilidad vehicular de la carretera vecinal desde el Puente la Villa, C.P. LOS ANGELES hasta el C.P. YACANGO permitiendo el traslado adecuado de pasajeros y carga.

❖ OBSERVACIÓN

: La Obra ejecutado bajo la modalidad Administración Indirecta- Obra por Contrata, con fecha 25 de Febrero del 2022 la entidad comunica decisión de resolución de contrato N 030-2018-GA/GM/A/MPMN por incumplimiento de obligaciones, paralización injustificada de obra, la cual ha quedado consentida; a la fecha (31/08/2022) se encuentra en la etapa de liquidación del contrato de obra y contrato de supervisión de obra. “LOS DATOS CONSIGNADO CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE OBRA EN SU MODALIDAD POR CONTRATO”

❖ PRESUPUESTO ACTUALIZADO

: S/ 25'829,539.09 Soles

❖ PRESUPUESTO ASIG. 2022

: S/ 5'100,944.00 Soles

❖ MONTO DE EJECUTADO MES DE AGOSTO

: S/ 0.00 Soles

❖ MOD. DE EJECUCION

: Administración Indirecta

❖ ESTADO ACTUAL

: ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

❖ FECHA DE INICIO DE OBRA POR CONTRATA

: 14/08/2019

❖ FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO

: 04/03/2022

❖ AVANCE FISICO

: 53.43 %

❖ AVANCE FINANCIERO

: 71.94 %

❖ MONTO DE CARTA FIANZA EMBARGADA

: S/. 6'414,391.44 Soles





MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

- ❖ **OBJETIVO** : El Objetivo del Proyecto es el Adecuado Servicio de Agua Potable y Sistema de Eliminación de Excretas en los Sectores de Santa Rosa, Omo y La Rinconada.
- ❖ **MONTO CONTRACTUAL DE EJEC. Supervisión contratada por la EPS MOQUEGUA S.A.** : S/. 19,898,579.64
: Monto definido por la EPS MOQUEGUA
- ❖ **PRESUPUESTO ASIGNADO 2022** : S/. 13,457,100.00
- ❖ **MONTO DE EJECUCION 2022** : S/. 1,863,048.40
- ❖ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 515 Días Calendarios
- ❖ **MODALIDAD DE EJECUCION** : Administración Indirecta
- ❖ **POBLACION BENEFICIARIA** : 1,888 beneficiarios
- ❖ **ESTADO ACTUAL** : PARALIZADA (Contrato Resuelto).
- ❖ **FECHA DE INICIO** : 20/01/2021
- ❖ **FECHA DE TERMINO** : 02/11/2022
- ❖ **AVANCE FISICO** : 38.94 %
- ❖ **PERSONAL OBRERO Y TECNICO** : 80 personas
- ❖ **OBSERVACIONES** : El contrato de ejecución de la obra ha sido resuelto parcialmente por obligaciones incumplidas del CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA, asimismo se esta realizando los tramites respectivos conforme a LCE y RLCE; respecto a la constatación física e inventario de obra y el expediente técnico de saldos de obra, para luego realizar los procedimientos de convocar a los siguientes postores del proceso de selección por orden de prelación, o realizar una contratación directa, o ejecutarlo por Adm. Directa.





MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

❖ OBJETIVO

:Reducción del índice de riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas del C.P. Los Ángeles y Anexos.

❖ MONTO CONTRACTUAL EJEC. + SUPERV.

: S/. 39,313,263.98

❖ PRESUPUESTO ASIG. 2022 (cierre de inversión)

: S/. 12,440.00

❖ MONTO DE EJECUCION 2022

: S/. 8,440.00

❖ PLAZO DE EJECUCIÓN

: 963 Días Calendarios

❖ MODALIDAD DE EJECUCION

: Administración Indirecta

❖ POBLACION BENEFICIARIA

: 4,939 beneficiarios directos.

❖ ESTADO ACTUAL

: CULMINADA-LIQUIDACION DE CONTRATOS

❖ FECHA DE INICIO

: 05/11/2017

❖ FECHA DE TERMINO

: 25/09/2020

❖ AVANCE FISICO

: 100.00 %





MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M0-562, TRAMO EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 CAMBRUNE - SOMOA, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA,

- ❖ **OBJETIVO** : Mejorar la Transitabilidad de la carretera MO-102 Cambrune – Somoa en una longitud de 3+016 km. Con el fin de mitigar riesgos inminentes de accidentes vehiculares, deslizamiento y/o desprendimiento de rocas.
- ❖ **MONTO CONTRACTUAL EJECUCIÓN** : S/. 3'827,150.44
- ❖ **PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUCIÓN 2022** : S/. 3'827,150.44
- ❖ **PRESUPUESTO ASIGNADO SUPERVISIÓN 2022** : S/. 165,336.32
- ❖ **MONTO DE EJECUCION 2022** : S/. 2'350,629.86
- ❖ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 150 Días Calendarios
- ❖ **PRESUPUESTO PRESTACION ADICIONAL 1** : S/. 558,710.07
- ❖ **PLAZO DE EJECUCION** : 29 Días Calendarios
- ❖ **MODALIDAD DE EJECUCION** : Administración Indirecta
- ❖ **MODALIDAD DE SUPERVISION** : Administración directa
- ❖ **ESTADO ACTUAL** : EN EJECUCION
- ❖ **FECHA DE INICIO CONTRACTUAL** : 21/03/2022
- ❖ **FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL (REPROGRAMADO)** : 31/08/2022
- ❖ **FECHA DE INICIO ADICIONAL 1** : 20/08/2022
- ❖ **FECHA DE TERMINO ADICIONAL 1** : 29/09/2022
- ❖ **AVANCE FISICO CONTRACTUAL** : 64.49%
- ❖ **AVANCE FISICO ADICIONAL** : 4.43%



28 Puestos de trabajo

PUESTOS DE TRABAJO



Moquegua, Moquegua, Perú
 Interoceánica Sur 19, Moquegua 18001, Perú
 Lat -17.177483° Long -70.894772°
 06/09/22 03:37 PM GMT -05:00

6 sep. 2022 4:12:11 p. m.
 S:16° 49.843 W:70° 40.923
 Altitud:3194.8m
 Velocidad:1.5km/h



TOTAL DE RESUMEN OBRAS POR CONTRATA

N°	DESCRIPCIÓN	ESTADO	MONTO CONTRACTUAL EJEC. + SUP.	MONTO ASIGNADO AÑO 2022	MONTO EJECUTADO AGOSTO 2022
1	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	ETAPA LIQUIDACIÓN CONTRATO	S/.24,942,949.86	S/.5,100,944.00	S/.0.00
2	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAKUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAKUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	EJECUCION	S/.25,464,143.77	S/.3,991,822.00	S/. 2,155,864.00
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CULMINADA	S/.30,086,430.89	S/.738,418.00	S/.184,370.15
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	EJECUCION	S/.19,898,579.64	S/.13,457,100.00	S/.1,863,048.40
5	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	CULMINADA	S/.39,313,263.98	S/.12,440.00	S/.8,440.00
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M0-562, TRAMO EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 CAMBRUNE - SOMOA, DISTRITO CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA,	EJECUCION	S/.3,827,150.44	S/.3,827,150.44	S/.2,350,629.86
TOTAL			S/.143,532,518.58	S/.27,127,874.44	S/.6,562,352.41





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONVENIO GRUPO MEXICO



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 358 DEL P.J. MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

- ❖ **OBJETIVO** : Ofrecer una adecuada prestación del Servicio educativo en la I.E.I. N° 358 del P.J. Mariscal Nieto , Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto – Moquegua
- ❖ **PRESUPUESTO CONVENIO (Southern Perú)** : S/. 5'102,668.86 Nuevos Soles
- ❖ **MONTO DE EJECUCION AL MES DE AGOSTO** : S/. 5'102,668.86 Nuevos Soles
- ❖ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 247 Días Calendarios
- ❖ **MODALIDAD DE EJECUCION** : Administración Indirecta
- ❖ **POBLACION BENEFICIARIA** : 599 Beneficiarios directos (población estudiantil de 3, 4 y 5 años) y a su vez la población que se encuentra aledaños.
- ❖ **ESTADO ACTUAL** : OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
- ❖ **FECHA DE INICIO** : 04/03/2020
- ❖ **FECHA DE TERMINO** : 20/09/2021
- ❖ **AVANCE FISICO** : 100.00%





MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

- ❖ **OBJETIVO** : Brindar una adecuada y suficiente oferta de servicios educativos en la I.E.I. N° 323 para el logro del aprendizaje de los alumnos de nivel inicial.
- ❖ **PRESUPUESTO CONVENIO (Southern Perú)** : S/. 4'640,585.31 Nuevos Soles
- ❖ **MONTO DE EJECUCION AL MES DE AGOSTO** : S/. 4'640,585.31 Nuevos Soles
- ❖ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 240 Días Calendarios
- ❖ **MODALIDAD DE EJECUCION** : Administración Indirecta
- ❖ **POBLACION BENEFICIARIA** : 137 beneficiarios directos (población estudiantil).
- ❖ **ESTADO ACTUAL** : OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
- ❖ **FECHA DE INICIO** : 13/01/2021
- ❖ **FECHA DE TERMINO** : 25/10/2021
- ❖ **AVANCE FISICO** : 100.00 %





AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. 346 DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

- ❖ **OBJETIVO** : Construir una infraestructura con una adecuada y suficiente prestación para así mejorar el servicio de educativo para la población escolar en la I.E.I. 346 del distrito de San Antonio.
- ❖ **PRESUPUESTO CONVENIO (Southern Perú)** : S/. 6'384,334.78 Nuevos Soles
- ❖ **MONTO DE EJECUCION AL MES DE AGOSTO** : S/. 6'384,334.78 Nuevos Soles
- ❖ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 300 Días Calendarios
- ❖ **MODALIDAD DE EJECUCION** : Administración Indirecta

- ❖ **POBLACION BENEFICIARIA** : 746 beneficiarios directos (población estudiantil de 3, 4 y 5 años) y a su vez la población que se encuentra aledaña.

- ❖ **ESTADO ACTUAL** : OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCIÓN
- ❖ **FECHA DE INICIO** : 01/07/2021
- ❖ **FECHA DE TERMINO** : 26/04/2022
- ❖ **AVANCE FISICO** : 100 %





ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS





ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – PERIODO 2022

DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO S/.
PROYECTOS CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2022	10	S/ 39,077,538.57
PROYECTOS <u>EN PROCESO</u> DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AGOSTO 2022	07	S/. 40,446,493.08
MANTENIMIENTOS CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2022	36	S/. 9,451,099.86
MANTENIMIENTOS <u>EN PROCESO</u> DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA A AGOSTO 2022	07	S/. 2,004,344.08
PROYECTOS CERRADOS CON FORMATO N° 09 (REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES 2022	07	S/. 9,600,827.67
PROYECTOS EN <u>PROCESO</u> DE CIERRE CON FORMATO N° 09 (REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES 2022	-	-
PROYECTOS TRANSFERIDOS 2022	-	-





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

La Subgerencia de Servicios Públicos es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos relacionados con la gestión de limpieza pública, así como acciones orientadas al mantenimiento, conservación y embellecimiento de parques, jardines y del mantenimiento de la infraestructura pública local, velando por el cumplimiento de las normas legales y disposiciones municipales concernientes a su competencia y comprende tres actividades principales:

- 1. META 006 - RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE.**
- 2. META 110 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PÚBLICOS.**
- 3. META 138 - LIMPIEZA PUBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.**

Plan aprobado **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°001-2022-GM/A/MPMN**, de fecha 04 de enero del 2022, denominado “SOSTENIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO”, por un monto de Importe del Plan de **s/. 1, 600,432.00**



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**



META 006 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

GASTO OPERATIVO

TOTAL PIM
S/. 899,784.00

AVANCE FINANCIERO S/. 678,777.70, HACE UN TOTAL DE 75.44% DE LO ASIGNADO SEGUN PIM.

AVANCE FISICO DEL 79.8 % DE LO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2022

LOGROS OBTENIDOS:

- Se realiza el manejo y recojo de residuos solidos de forma adecuada, la puesta en funcionamiento de los contenedores soterrados fue fundamental para fortalecer la actividad y disposición de la misma.
- Se logro mitigar los distintos puntos de acumulación critica de residuos solidos, escombros, entre otros como son; los contenedores de la carretera binacional frente al coliseo Chen Chen, contenedores de carretera Toquepala, contenedores metálicos prolongación calle siglo con 8 de septiembre, limpieza del borde del malecón ribereño, entre otros.
- Así mismo se realiza el cumplimiento con todas las recomendaciones de la OEFA.

ANTES



DESPUES





META 110

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PUBLICOS

GASTO OPERATIVO

TOTAL PIM
S/. 345,930.00

**AVANCE FINANCIERO DE S/.
223,243.30, HACE UN TOTAL DEL
65.38%, DE LO ASIGNADO SEGÚN PIM.**

**AVANCE FISICO DEL 69.53 % DE LO
PROGRAMADO PARA EL AÑOS 2022**

LOGROS OBTENIDOS:

- Se realiza el mantenimiento de todos los parques, bermas y áreas verdes de las principales vías de la Provincia Mariscal Nieto, controlando las plagas, creando camas florales, manteniendo y mejorando el ornato de ciudad de Moquegua.
- se realizaron labores de Mantenimiento al área verde del Colegio Simón Bolívar, el podado de área verde y arboles de la beneficencia, podado y limpieza de arboles e el barrio Belén, entre otros.
- Así mismo se tiene el logro significativo de la recuperación de los juegos mecánicos y recreativos en un 100% del Parque Mirador Turístico “Cristo Blanco”.

ANTES



DESPUÉS





META 138 LIMPIEZA PUBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

GASTO OPERATIVO

TOTAL PIM
S/. 406,268.00

**AVANCE FINANCIERO DE S/. 318,928.90,
HACE UN TOTAL DEL 78.50%, DE LO
ASIGNADO SEGÚN PIM**

**AVANCE FISICO DEL 77 % DE LO
PROGRAMADO PARA EL AÑOS 2022**

LOGROS OBTENIDOS:

- Se alcanzo logros importantes en lo que respecta a la salud publica, realizando el apoyo a los distintos centros educativos de la provincia como son; C.E.I. 153 “Sagrado Corazón de Jesús”, I.E. Daniel Becerra Ocampo, la limpieza del Malecón Ribereño, entre otros.
- En la coyuntura actual generada por el estado de emergencia causado por el Covid-19, se mantuvo las vías de la Provincia Mariscal Nieto completamente limpias, con el personal debidamente implementado con sus EPPS, evitando la propagación de todo tipo de bacterias o vectores.





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN




MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

PRESUPUESTO 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

DESCRIPCION	PIM ASIGNADO 2022	DEVENGADO	SALDO
ACTIVIDAD EN EJECUCION	1,323,726.00	757,876.88	592,721.01

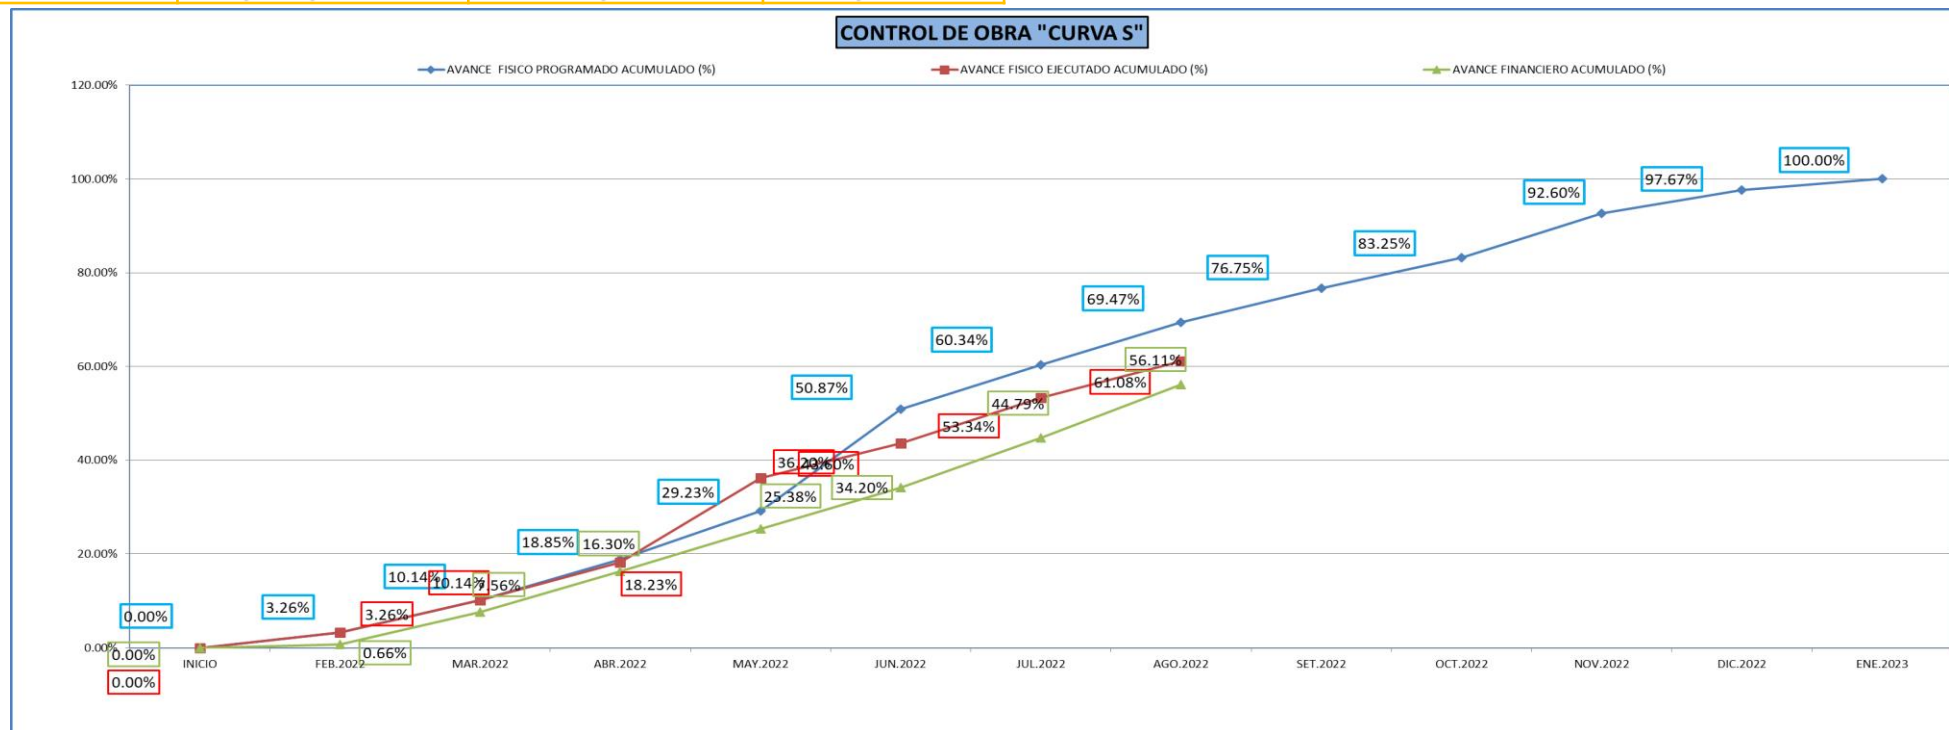

PIM 2022 APROBADO	1 350,597.00
PIM ASIGNADO 2022	1 323,726.00
SALDO PIM	26,871.89



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir




ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Nº	ESTADO	ACTIVIDADES	META	UBICACIÓN	SECTOR	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	AVANCE FISICO	% AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
1	EJECUCIÓN	“MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN DE 09 AREAS RECREATIVAS, JARDINERAS Y SARDINELES DE 12 PRINCIPALES AVENIDAS DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”	198	CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN	PARQUES Y JARDINES	Res. de Ger. de Infraestructura Pública N°038-2022-GIP/GM/MPMN (11/02/2022)	S/ 1 350,597.89	334	S/ 667,932.37	61.08%	S/ 757,876.88	56.11%





PANEL FOTOGRAFICO

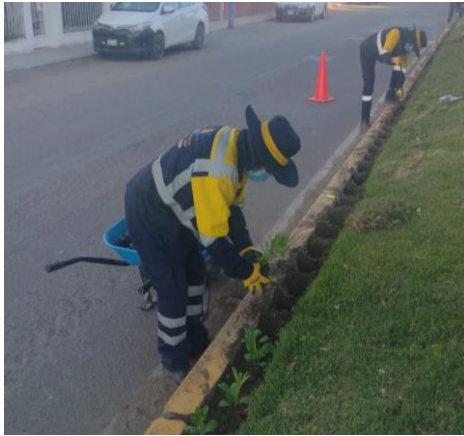

LOGROS OBTENIDOS EN EL 2022 (FEBRERO – AGOSTO)



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

- SE GENERARON UN PROMEDIO DE **166 PUESTOS DE TRABAJO** (MUJERES 91 Y VARONES 65) EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN DE 09 AREAS RECREATIVAS, JARDINERAS Y SARDINELES DE 12 PRINCIPALES AVENIDAS DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA” DURANTE EL PERIODO **FEBRERO - AGOSTO**.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS MOVILES EN EL PARQUE DEL MIRADOR
- SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES.
- EL MANTENIMIENTO **HA CUMPLIDO CON EL GASTO PREVISTO ASIGNADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO 2022.**
- SE PROMOVÍÓ LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES, ASÍ SEGUIR ACTIVANDO LA ECONOMÍA EN LA REGIÓN DE MOQUEGUA.

DIFICULTADES

- INCONVENIENTES EN LA CONTRATACIÓN DE MANO CALIFICADA DE ACUERDO A LA ESCALA DE PAGO ESTABLECIDO YA QUE EL PAGO BRUTO ES MUY INFERIOR AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.
- ALGUNOS RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
- EL EXPEDIENTE NO ESTUVO FORMULADO 100% A LA NECESIDAD, POR LO QUE TUVO QUE MODIFICARSE OCACIONANDO RETRASO PARA LAS NUEVOS INSUMOS Y SERVICIOS REFORMULADOS.



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

➤ **OBJETIVO:**

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en este caso a través de garantizar el buen estado óptimo y funcionamiento de las áreas verdes de los Parques, plazas, Óvalos y avenidas principales de la ciudad de Moquegua, de tal forma que contribuya con el mejoramiento del ornato de la ciudad.

➤ **UNIDAD EJECUTORA:**

Dicha ejecución estuvo a cargo de la Gerencia de los Servicios a la Ciudad (Sub Gerencia de Servicios Públicos).

- **FUENTE FINANCIAMIENTO** : Canon Minero
- **PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC.** : S/. 2,083,507.19 Soles
- **MOD. DE EJECUCION** : Administración Directa
- **PLAZO DE EJECUCION** : 333 DIAS CALENDARIO.
- **UBICACIÓN**
 - Distrito** : Moquegua
 - Provincia** : Mariscal Nieto
 - Región** : Moquegua
- **TERRITORIO ABARCADO** : Parques, Plazas, Avenidas y Óvalos de la Ciudad de Moquegua.
- **POBLACION BENEFICIADA** : Población de Moquegua.





FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

➤ **SITUACION DE OBRA EJECUTADA:**

AVANCE FÍSICO

AVANCE FISICO		
PROGRAMADO (%)	EJECUTADO TOTAL (%)	SALDO (%)
1,714,820.74	938,094.01	776,726.73
100.00%	54.71%	45.29%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO		
PROGRAMADO (%)	EJECUTADO TOTAL (%)	SALDO (%)
2,083,507.19	1,219,727.34	863,779.85
100.00%	58.54%	41.46%

DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO EJECUTADO
RENOVACION URBANA CON ESPECIES FLORALES	Jgo	265.49
PODAS DE ESPECIES FORESTALES MENORES A 5m DE ALTURA	Und	2,940.00
PODAS DE ESPECIES FORESTALES MAYORES A 5m DE ALTURA	Und	101.00
PERFILADO Y PODAS DE GRASS NATURAL	M2	197,772.68
LAVADO DE ESPECIES FORESTALES MENORES A 5m DE ALTURA	Und	3,005.00
LAVADO DE ESPECIES FORESTALES MAYORES A 5m DE ALTURA	Und	148.00
RIEGO PARA CONSERVACION DE ESPECIES EN ÁREAS VERDES DE VÍAS	Día	172.00
CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	M3	739.27





FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

➤ **DIFICULTADES:**

- Demora en atención a los requerimientos de bienes y servicios por parte de la oficina de Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, lo que origina un retraso en la ejecución de las metas físicas.
- Se encontró vicios ocultos, donde alguna de las actividades primordiales para la ejecución de las metas físicas no se encuentran consideradas dentro del expediente, lo cual requiere una modificación del expediente técnico, de partidas nuevas, mayores metrados y deductivos.

➤ **ACCIONES A MEJORAR:**

- Dar mayor celeridad en el trámite documentario, puntualidad de presentación de informes y atención de los requerimientos de bienes y servicios, modificaciones presupuestales (de ser el caso) entre otros documentos lo cual generaría retrasos en la ejecución de algunas actividades físicas y amerite modificación del expediente técnico y ampliación de plazo.
- Cabe indicar que, los trabajos de conservación para el mantenimiento de la infraestructura pública son muy fundamentales, asimismo debe ser considerada una actividad sustancial de manera rutinaria para la mejora del ornato de la ciudad, lo cual debería realizarse de forma periódica mediante fichas de mantenimiento.





FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

❑ PANEL FOTOGRÁFICO:



RENOVACION URBANA
CON ESPECIES FLORALES



PODAS DE ESPECIES FORESTALES
MENORES A 5m DE ALTURA



PODAS DE ESPECIES FORESTALES
MENORES A 5m DE ALTURA



PERFILADO Y PODAS DE GRASS
NATURAL





FICHA DE MANTENIMIENTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE 27 PARQUES PÚBLICOS, 5 OVALOS Y 11 SARDINELES EN AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

❑ PANEL FOTOGRÁFICO:



PERFILADO Y PODAS DE GRASS
NATURAL



LAVADO DE ESPECIES FORESTALES
MENORES A 5m DE ALTURA



RIEGO PARA CONSERVACION DE
ESPECIES EN ÁREAS VERDES DE
VÍAS



CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS





DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

- **Actividad** : “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS MEDIANTE LA LIMPIEZA DE VÍAS, REPARACIÓN Y PINTADO DE SARDINELES DEL CERCADO, PJ EL SIGLO, AA.HH. MARISCAL NIETO Y VÍAS PRINCIPALES DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”
- **Entidad** : Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
- **Gerencia** : Gerencia de Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Servicios Públicos
- **Fuente de Financ.** : Recursos Determinados, Canon y Sobre canon
- **Presupuesto Asignado** : S/. 1'889,120.00 Soles
- **Modalidad de Ejecuc.** : Administración Directa





CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCE FÍSICO

AVANCE FISICO		
PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	POR EJECUTAR
1,529,651.82	990,410.33	539,241.49
100.00%	64.75%	35.25%

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO		
PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	POR EJECUTAR
1,889,120.00	1,097,770.57	791,349.43
100.00%	58.11%	41.89%



ACUMULACIÓN, ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL RESIDUAL EN VÍAS





LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

SEGURIDAD Y SALUD	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCION
SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00	100.00%
MONITOREO Y EVALUACION MEDICA	MES	11.00	7.00	63.64%
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA	JGO	1.00	1.00	100.00%
CAPACITACION A PERSONAL OBRERO EN SEGURIDAD, SALUD Y PLAN COVID 19	MES	11.00	7.00	63.64%
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1.00	1.00	100.00%
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19	UND	1.00	1.00	100.00%

CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	UNIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCION
ACUMULACION DE MATERIALES RESIDUALES EN VIAS	M2	2,186,949.37	1,582,323.79	72.35%
ACARREO DE MATERIALES RESIDUALES EN VIAS	M3	2,822.95	2,109.53	74.73%
ELIMINACION DE MATERIALES RESIDUALES EN VIAS L=7KM	M3	2,822.95	2,109.53	74.73%





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES: La ejecución de la presente Ficha Técnica de Mantenimiento, es para restablecer las condiciones de las vías de los diferentes sectores a intervenir, con la finalidad de brindar seguridad, productividad, confort, imagen, salubridad e higiene, garantizando la calidad de vida de la población en general.

La ejecución de la presente Ficha de Mantenimiento hasta la actualidad ha generado un aproximado de 250 puestos de trabajo en beneficio de la población de Moquegua.

La ejecución de los trabajos de mantenimiento se realiza respetando los protocolos de bioseguridad ante una posible propagación de contagios del Covid-19.

RECOMENDACIONES: La conservación de la Infraestructura Vial mediante la eliminación de material residual en los distintos sectores de la ciudad, deben realizarse de forma anual a fin de garantizar la salud, higiene y confort de la población de Moquegua.



FICHA TÉCNICA - "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL BOTADERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

PPTO. EXP. TECNICO		: S/. 827,026.55		DESCRIPCION DEL PROYECTO:	
PPTO. ADICIONAL N° 01		: -		1.- OBJETIVOS	
PPTO. TOTAL		: -			
EJECUCION ACUMULADA					
AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		- Mejorar el servicio de eliminación de residuos sólidos con el mantenimiento periódico de las rutas de acceso y equipos de recolección y transporte de residuos sólidos.	
S/.	%	S/.	%		
573,871.96	84,31%	690,260.21	83,46%		
BENEFICIARIOS		TODOS LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.		2.- METAS EJECUTADAS	
UBICACIÓN				- Trazo y Replanteo durante la Ejecución Limpieza y carguío manual de Residuos Solidos de Superficie de Rodadura y Bordes - Transporte de Residuos Solidos Existentes en Acceso DP = 2Km - Corte y Perfilado de Material Suelto. - Carguío y Eliminación de Material Excedente Dpro = 10Km - Preparación de material propio para relleno. - Relleno, nivelación y compactación con material propio preparado - Carguío y eliminación de material excedente Dpro. 10 km - Control de Polvo mediante riego con Agua.	
REGION	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR		
MOQUEGUA	MCAL NIETO	MOQUEGUA	QUEBRADA DE CEMENTERIO		

INTERVENCION ACCESO PRINCIPAL PROG. 0+ 000 a 1+458



FIG. N°01: RELLENO DE MATERIAL PROPIO.



FIG N°02: PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO.

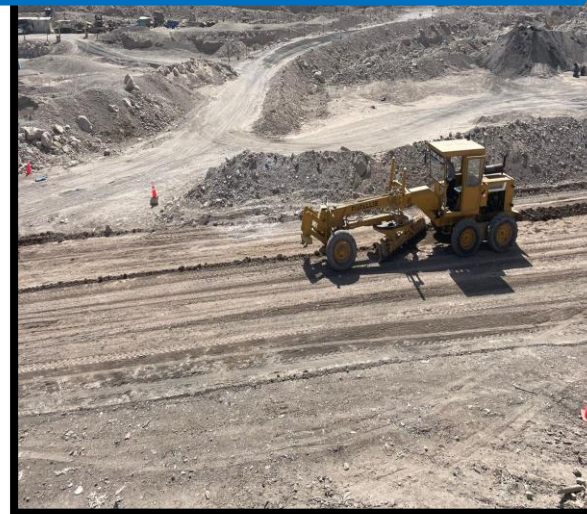


FIG. N°03: NIVELACIÓN CON MATERIAL PROPIO DE RELLENO.



FIG. N°04: COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO PREPARADO .



FIG. N°05: CARGUÍO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom. 10 Km.



FIG. N°06: TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO.



FIG. N°07: RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO PREPARADO

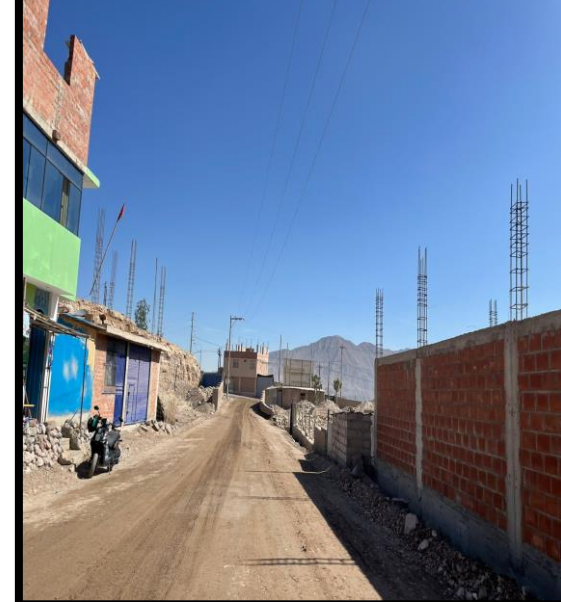


FIG. N°08: RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO PREPARADO

INTERVENCION ACCESO INTERNOS (Lateral Derecho y Izquierdo)



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO



FIG. N°10: CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO..



FIG. N°11: CARGUIO DE RESIDUOS SOLIDOS.



FIG. N°12: CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO.



FIG. N°13: CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO CON AGUA.



FIG. N°14: CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO.



FIG. N°15: NIVELACION CON MATERIAL PROPIO PREPARADO .



LOGROS ALCANZADOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS SEMESTRE I - 2022

ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO – DISTRITO MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”. META 273.

I. Breve descripción de la Actividad y/o Ficha de Mantenimiento:

La presente actividad de ficha de mantenimiento es para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes públicos de la jurisdicción de la ciudad de Moquegua, en la necesidad inmediata para la reparación y mantenimiento de los vehículos, dispositivos y maquinarias, mediante el adecuado mantenimiento e inclusive reposición de las mismas donde corresponda, con la finalidad de prolongar el tiempo útil de las unidades vehiculares de la ficha de mantenimiento, de la ciudad de Moquegua, de tal forma que contribuya con el mejoramiento de la operatividad de los vehículos, dispositivos y maquinarias de la Sub Gerencia de Servicios Públicos.





II. Principales logros para el cumplimiento de las metas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO EJECUTADO
04.01.01.47	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE MUELLE COMPLETO POSTERIORES DE CAMION COMPACTADOR VOLVO DE RRSS	Jgo	2.00
04.01.02.41	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS DE CAMION COMPACTADOR VOLVO DE RRSS	jgo	1.00
04.01.03.25	UMINISTRO Y REPOSICIÓN DE MUELLE COMPLETO POSTERIORES DE CAMION COMPACTADOR	Jgo	2.00
04.01.04.20	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE VOLANTE EMBRAGUE DE CAMION COMPACTADOR VOLVO DE RRSS	jgo	1.00
04.01.05.20	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS DE CAMION COMPACTADOR MERCEDES BENZ	jgo	1.00
04.02.01.33	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS DE CAMION CISTERNA	kit	1.00
04.03.02.29	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EMPAQUETADURA DE CULATA DE CAMION BARANDA	und	4.00
04.05.01.19	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LLANTAS DELANTERAS DE CAMION VOLQUETE	und	2.00
04.06.01.12	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SISTEMA DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA MINICARGADOR	und	2.70
04.07.01.16	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE Y SISTEMA DE FILTRO DE MOTOR PARA TRACTOR	und	2.70
04.08.01.21	SUMINISTRO Y REPOSICION DE EMBRAGUE Y ACCESORIOSDE CAMIONETA FORD	jgo	1.00
04.08.02.21	SUMINISTRO Y REPOSICION DE EMBRAGUE Y ACCESORIOS CAMIONETA NISSAN	jgo	1.00





2.1 Ejecución financiera

PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE AL I SEMESTRE
S/.	S/.	S/.	
	548,765.00	368,820.82	67.21%



PANEL FOTOGRAFICO



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 2022



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



GERENCIA MUNICIPAL

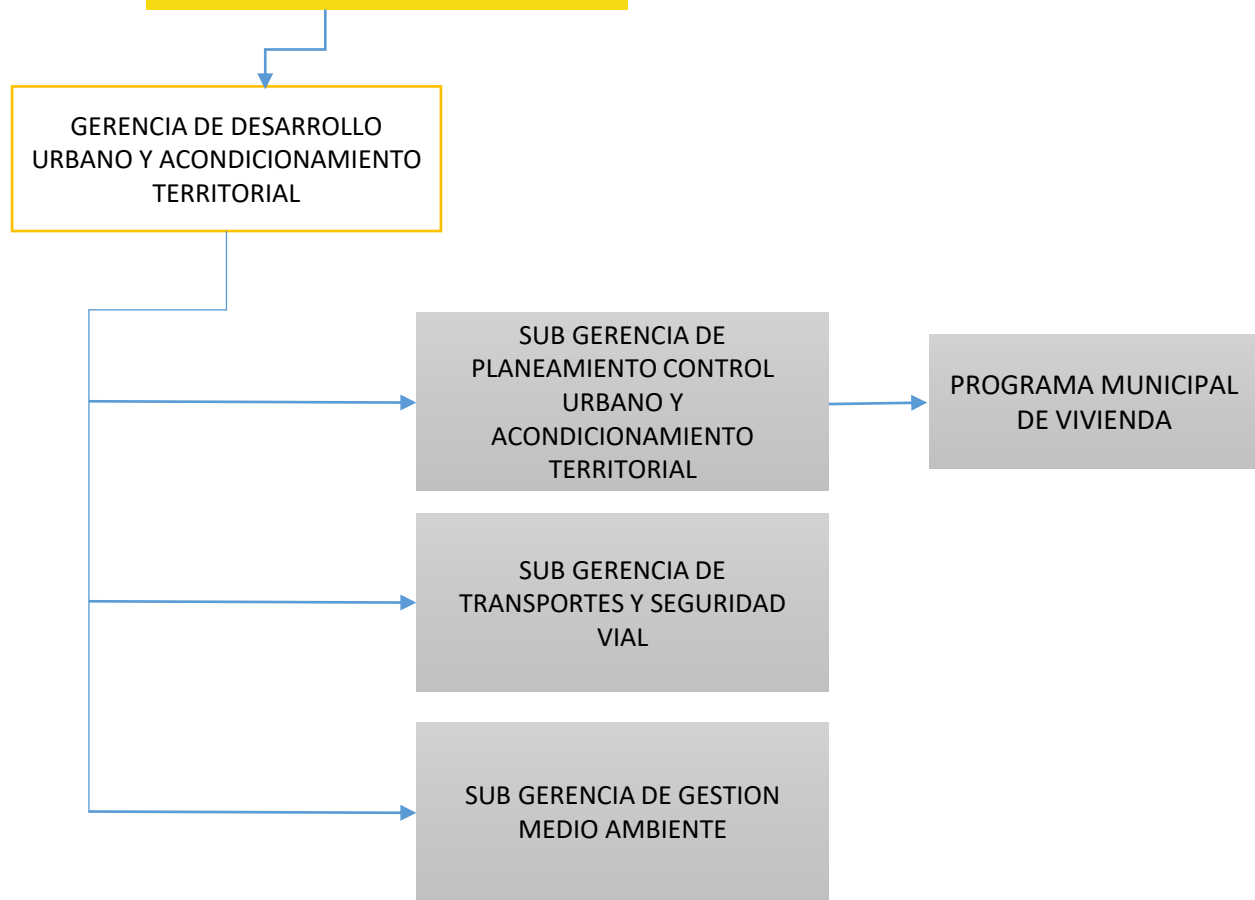



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SPCUAT 2022



MOQUEGUA

el mejor lugar para vivir



PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROMUVI

2022	PRESUPUESTO		RESOLUCIÓN
	ASIGNADO	EJECUTADO	
SPCUAT	S/. 609,147.13	S/. 410,655.42	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°511-2021-GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°275-2022-GM/A/MPMN
PROMUVI	S/. 354,180.36	S/. 204,164.93	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°511-2021-GM/A/MPMN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°276-2022-GM/A/MPMN
TOTAL	S/.963,327.49	S/.614,820.35	





RECAUDACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - PROMUVI

ENERO – AGOSTO



2021	RECAUDACIÓN
SPCUAT	S/.1,155,552.00
	S/.156,136.09
PROMUVI	S/. 221,878.68
TOTAL	S/1,533,566.77



RECAUDACIÓN
ADICIONAL DE
S/.1,155,552.00 POR
SUBASTA PÚBLICA.


2022	RECAUDACIÓN
SPCUAT	S/.499,233.96
PROMUVI	S/. 362,257.86
TOTAL	S/861,491.82






GESTION DE RIESGOS


GESTIÓN DE RIESGOS	
TIPO DE PROCESO	CANTD
Análisis de Riesgos MUNIMOQ	05
TOTAL	05

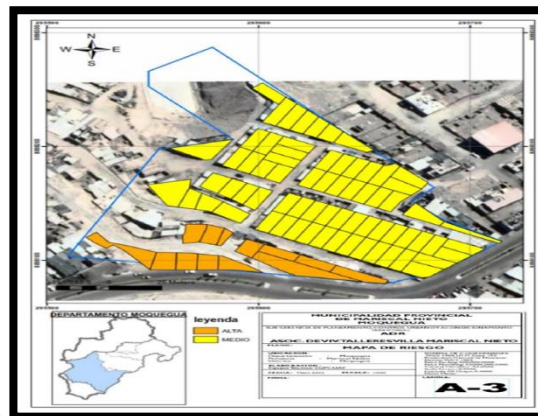

ASOCIACION DE VIVIENDA
TALLERES VILLA
MARICASL NIETO

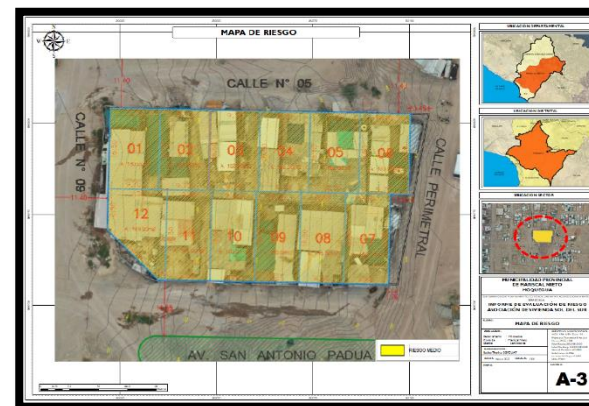


ASOCIACION DE VIVIENDA
SOL DEL SUR -DISTRITO DE
SAN ANTONIO

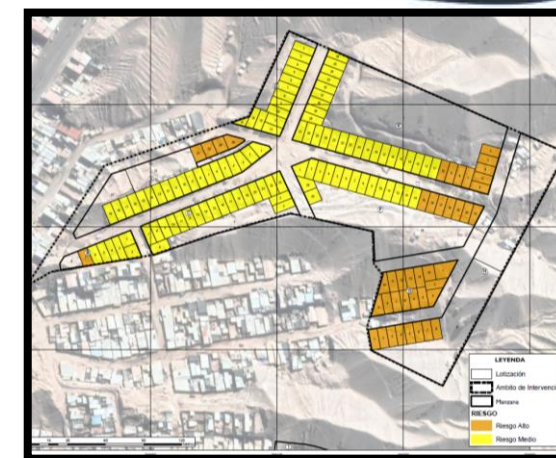

SECTOR A6-4A
DISTRITO DE SAN ANTONIO




SECTOR DE VIVIENDA
TUSUN WASI DISTRITO DE
SAN ANTONIO

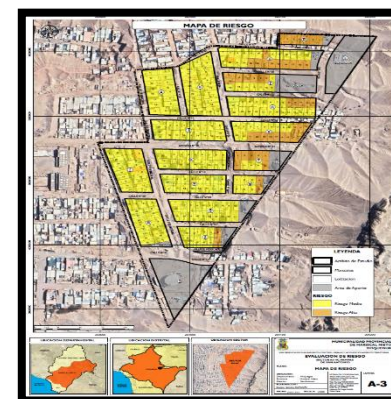

SECTOR A6-4C
DISTRITO DE SAN ANTONIO

LOGRO: Cambiar la zonificación para adjudicarse por medio del PROMUVI para el 2023.

Total: A favor de 1585 habitantes

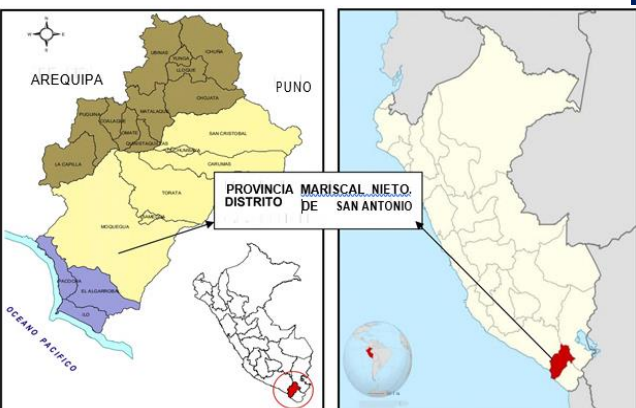

HABILITACIONES URBANAS




Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

**07 HAB URB ,
2836 HABITANTES**

DISTRITO/C.POBLADO	SECTOR /SUB SEC	ASOCIACION	CANT. DE BENEFICIADOS
CP DE CHEN CHEN	SECTOR A-15	MERCADO DE CHEN CHEN	750 habitantes
CP DE CHEN CHEN	1A-4 PAMPAS DE CHN CHEN	-	120 HAB
DISTRITO DE SAN ANTONIO	PARCELA 9	A.V VIRGEN DE FATIMA	100 HAB
CP DE CHEN CHEN	A-2	VILLA CHEN CHEN	450 HAB
MOQUEGUA	PARCELA EX FUNDO SAN FRANCISCO	-	250 HAB
DISTRITO SAN ANTONIO	CUA2 TRADICIONES MOQ	-	468 HAB
C. P. CHEN CHEN	PLANO TRAZADO Y LOTIZACION DEL FUNDO PARCELA B – SECTOR CERRO BLANCO	-	698 HAB




**PARCEL 9
AV. VIGEN DE FATIMA**

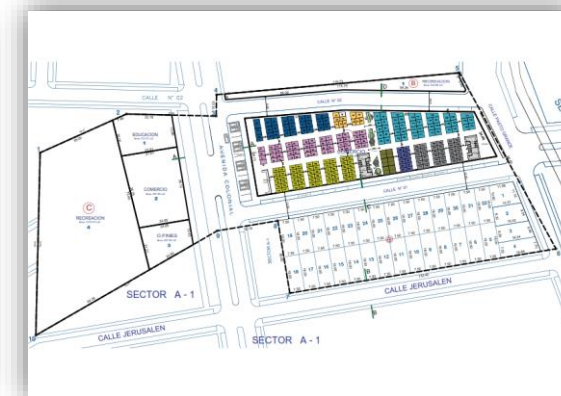

**SECTOR A-15
MERCADO CHEN CHEN**



**FUNDO PARCELA B –
SECTOR CERRO BLANCO**

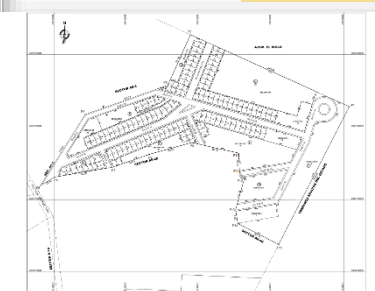

**CUA2
TRADICIONES MOQ**



**1 A-4 PAMPAS DE
CHEN CHEN**



MOQUEGUA
el mejor lugar para **vivir**




CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN

DISTRITO/C. POBLADO	SECTOR	ASOCIACION	CANT. DE BENEFICIADOS / FAMILIAS	LOGRO
C.P. DE CHEN CHEN	SECTOR A-8	MONTERRICO	43 FAMILIAS	APROBACIÓN DE PLAN ESPECÍFICO
C.P. DE CHEN CHEN	A-7	INDEPENDIENTES	16 FAMILIAS	APROBACIÓN DE PLAN ESPECÍFICO
SAN ANTONIO	A6-4 A	CUA2 TRADICIONES MOQ	104 FAMILIAS	APROBACIÓN DE PLAN ESPECÍFICO
C.P. DE CHEN CHEN	A-2	VILLA CHEN CHEN	04 FAMILIAS	ESTUDIO DE CAMBIO DE ZONIFICACION
SAN ANTONIO	A6-4 C	FLOR DE LIZ CERRO VERA CRUZ PIRAMIDES VILLA FLOR DE LIZ	296 FAMILIAS	AUDIENCIA
SAN ANTONIO	SECTOR 2B	HATUN WASI	05 FAMILIAS	AUDIENCIA


- **01 CAMBIOS APROBADOS**
- **03 PLAN ESPECIFICO**
- **468 FAMILIAS BENEFICIADAS**



SECTOR A-2

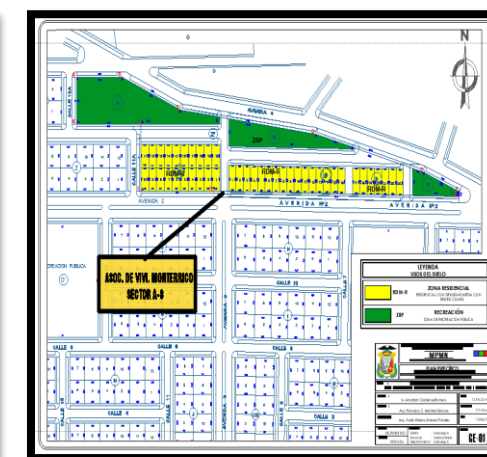

MONTECRICO

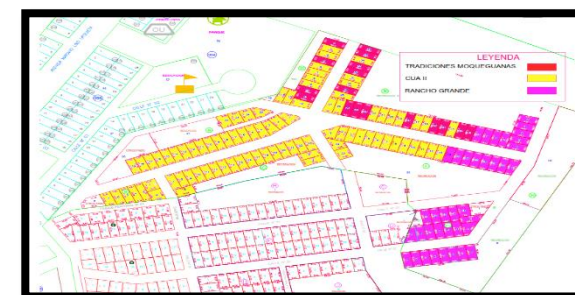

A6-4B
AV. CUA2 A.V TRAD MOQ





INCORPORACIONES A PROMUVI

02 SECTORES
55 FAMILIAS

DISTRITO/C.PO BLADO	SECTOR	ASOCIACION	CANT. DE BENEFICIADOS
CP DE CHEN CHEN	1A-4	ASOC. BICENTENARIO CHEN CHEN	18 FAMILIAS
CP DE CHEN CHEN	1A-7	CERRO BUENA VISTA	37 FAMILIAS



SUB SECTOR 1 A-7



SUB SECTOR 1 A-4





LOGROS DEL ÁREA DE TOPOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN	CANT
• Levantamientos Topográficos.	25
• Elaboración de Planos (superficies, curvas de nivel, secciones, perfiles, planos de ubicación y planos perimétricos).	28
• Replanteos Topográficos.	29
• Ortofotos	25

**107 TRABAJOS
EJECUTADOS**



SOL DEL SUR



MONTERRICO



SECTOR A-2



CUA II
TRADICIONES MOQUEGUA





PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI





SECTOR	ASOC. VIVIENDA	CANTIDAD DE LOTES	LOGRO
Sub Sector 1A-7 Pampas de Chen Chen	▪ Cerro Buena Vista	37 Lotes de Terreno	Incorporación a PROMUVI El 20 de abril de 2022
Sub Sector 1A-4 Pampas de Chen Chen	▪ Bicentenario de Chen Chen	18 Lotes de Terreno	Incorporación a PROMUVI En marzo de 2022
Sector A6-4C San Antonio	▪ Cerro Veracruz ▪ Villa Flor de Liz ▪ Piramides	270 Lotes de Terreno	Posible Incorporación a PROMUVI En el mes de setiembre del 2022
Sector A6-4A San Antonio	▪ Cua II ▪ Tradiciones	104 Lotes de Terreno	Posible Incorporación a PROMUVI En el mes de setiembre del 2022

LOGROS PROMUVI 2022:



219 TITULOS De Propiedad

CAMPAÑAS DE TITULACIÓN	TÍTULOS DE PROPIEDAD	ENTREGA TOTAL	RECAUDACIÓN TOTAL ANUAL
01 Entregas Ejecutadas	141 Títulos de Propiedad 20-05-2022	141	Recaudación a la fecha: S/. 362,257.86
01 Entregas pendientes	78 Títulos de propiedad para entrega en ceremonia de titulación. 01-06-2022 / 31-08-2022	78	





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL




Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

Es la unidad orgánica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto encargada de planificar proponer y regular los sistemas de tránsito, transporte urbano e interurbano acorde a las normas nacionales y complementarias.

Cuenta con una estructura interna de siete (07) áreas internas que permiten atender los trámites de competencia de la mencionada subgerencia.

Organigrama Estructural



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



INGRESO PRESUPUESTAL – AÑO 2022

AREA DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	→	TOTAL S/ 73966.70
AREA DE SERVICIO DE TAXI	→	TOTAL S/ 108528.50
AREA DE VEHICULOS MENORES	→	TOTAL S/ 51275.20
AREA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES		
PAPELETAS	→	TOTAL S/ 1,073,928.66
ACTAS DE CONTROL	→	TOTAL S/ 109,015.40
ACTAS DE INTERVENCION	→	TOTAL S/ 21,240.14
OTROS CONCEPTOS	→	TOTAL S/ 7,461.88



TOTAL RECAUDADO
S/ 1,445,416.48






LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

Autorización	212
Habilitación Vehicular	578
Habilitación de conductor	447



TOTAL S/ 73966.70



AREA DE SERVICIO DE TAXI

Autorización	48
Autorización (renovación)	68
Habilitación Vehicular	2607
Habilitación de conductor	1784

TOTAL S/ 108528.50






LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA DE FISCALIZACION

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	Vehículos Intervenidos	2553
	Internamiento de vehículos	88
ACTAS DE CONTROL IMPUESTAS	Covid-19	376
	Regular	496
ACTAS DE INTERVENCION OM-016-2020-MPMN	Actas de intervención	1113
	Actas de Abandono	22
DEPOSITO MUNICIPAL	Internamiento vehículos	114
	Internamiento motos	395
	Internamiento por secuestro conservativo	8

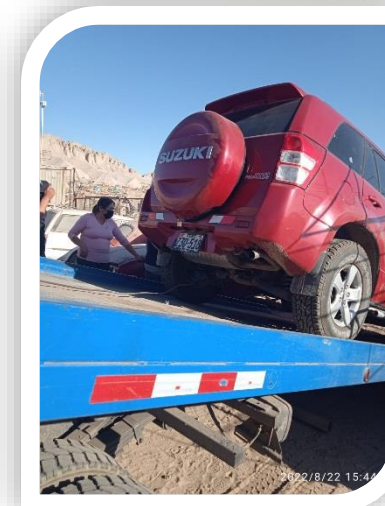



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

N°	Descripción	Total
1	Cantidad de Resoluciones de Sanción al Reglamento Nacional de Administración de Transportes atendidos.	234
2	Cantidad de Resoluciones de Sanción al Reglamento Nacional de Tránsito atendidos.	1538
3	Cantidad de expedientes para Segunda Instancia remitidos a la GDUAAT.	80
4	Cantidad de notificaciones de Resoluciones realizadas.	633
5	Cantidad de Licencias de Conducir en custodia por incumplimiento al Reglamento Nacional de Administración de Transportes.	51
6	Cantidad de Licencias de Conducir en custodia por incumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito.	1284

Expedientes Atendidos



3820

PAPELETAS

TOTAL S/ 1,073,928.66

ACTAS DE CONTROL

TOTAL S/ 109015.40

ACTAS DE INTERVENCION

TOTAL S/ 21240.14

OTROS CONCEPTOS

TOTAL S/ 7461.88



TOTAL 1211646.08




AREA DE AUTORIDAD INSTRUCTORA

- i. Cantidad de informes finales de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de administración de transporte atendidos.
 - Se ha generado un total de 647 respecto de las Actas de Control
- ii. Cantidad de informes finales de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de tránsito atendidos
 - Se ha generado un total de 1320 Informes Finales de Instrucción referidos a Descargos y sanciones de oficio.
- iii. Cantidad de informes finales de instrucción generados por faltas a la OM n°016-2020-mpmn
 - Se ha generado un total de 29 referidos a Actas de Intervención
- iv. Cantidad de resoluciones de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de administración de transporte atendidos.
 - Se ha generado un total de 92 Resoluciones de Caducidad e inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.
- v. Cantidad de resoluciones de instrucción generados por faltas al reglamento nacional de tránsito atendidos
 - Se ha generado un total de 1640 Resoluciones de Caducidad e Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador
- vi. Cantidad de resoluciones de instrucción generados por faltas a la OM n°016-2020-mpmn
 - No se ha emitido hasta la fecha ninguna, encontrándose pendiente de formular las resoluciones debido a la falta de personal profesional.
- vii. Cantidad de cartas emitidas de exhortación por incumplimientos al reglamento nacional de administración de transporte
 - Se ha emitido un total de 150 cartas de exhortación por incumplimientos a las condiciones de acceso y permanencia.
- viii. Cantidad de notificaciones de resoluciones y demás documentos realizados.
 - Resoluciones de Caducidad e Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador 1533

**Expedientes
Atendidos**



5411





LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022

AREA VEHICULOS MENORES	Licencias nuevas	S/ 24397.60
	Revalidación	S/ 3875.00
	Duplicados	S/ 966

TOTAL S/ 51275.20



AREA DE PREVENCION	Capacitaciones	13
	Personas Capacitadas	1217



LOGROS ALCANZADOS – AÑO 2022



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

La subgerencia de transportes y seguridad vial a realizado el presente año (enero a agosto 2022) las siguientes propuestas normativas al pleno de consejo para su aprobación, siendo:

➤ Ordenanzas

1. Amnistía de papeletas y actas de control
2. Casilla virtual
3. Incorporación de la ruta 2 al plan regulador de rutas
4. Implementación de zonas rígidas
5. Reglamento de transporte urbano e interurbano
6. Reglamento de transporte especial de taxi
7. Reglamento de vehículo menores (delivery)

➤ Decretos

1. Restricción de accesibilidad a principales vías del cercado de la ciudad por marchas políticas.
2. Regulación de flota vehicular para los días domingos sobre estado emergencia (40%).
3. Incremente de flota vehicular para los días domingos sobre estado emergencia (60%).



MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE





PROGRAMA MUNICIPAL (EDUCCA).



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 096-2022-GM/A/MPMN, aprueba el “Plan de trabajo anual del programa municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental para el año 2022.

N°	CAMPAÑAS DESARROLLADAS	LUGAR
01	Campaña de como usar los contenedores de botellas de plástico	Mercado Chiribaya, Manco Cápac y Bello Amanecer
02	Charlas a restaurantes de Moquegua sobre la Ley N° 30884	Restaurantes de la localidad
03	Charlas de capacitación sobre segregación adecuada de Residuos	Escuela de Aviación del Ejército
04	La Hora del Planeta	Plaza de Armas Moquegua
05	Campaña informativa del RAEEcicla para ayudar Moquegua 2022	Cercado de Moquegua y Distrito de San Antonio

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).

Recepción de 3 T de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la Empresa Anglo American Quellaveco.



Se firmó un convenio con RECOLECC, con el fin de darle un manejo adecuado a los residuos para prevenir riesgos a la salud y preservar el medio ambiente.

05 Campañas de RAEE desarrolladas en diversos sectores

- ✓ Cercado Moquegua
- ✓ San Antonio
- ✓ San Francisco
- ✓ Los Ángeles
- ✓ Samegua.

CERCADO DE MOQUEGUA



Este **Sábado 18 de Junio** te esperamos en la **Plaza Andrés Avelino Cáceres (ex Alameda)** para recolectar todos tus **Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.**

- ¿Qué puedes llevar?**
- Computadoras malogradas, licuadoras
 - Televisores rotos, celulares viejos
 - Lámparas viejas, focos leds
 - Tablets rotas, audífonos viejos
 - Planchas viejas, cámaras rotas
 - Todo aparato Eléctrico o Electrónico en desuso



Desde las **8 a.m.** hasta las **12 p.m.**
Mayores informes al **965 773 121**



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIOS AL SEIA

06 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE N° 5 DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA”

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS EN TEMPORADAS DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

“RECUPERACIÓN Y CIERRE DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL BOTADERO DE LA QUEBRADA CEMENTERIO PAMPAS DE CHEN-CHEN, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

“MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA TRANSITABILIDAD DE VÍAS MEDIANTE PARCHADOS EN CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTO RÍGIDO Y OTROS EN LA A.A.H.H. MARISCAL NIETO, P.J. EL SIGLO Y EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”

“MANTENIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL MEDIANTE PARCHADOS EN CARPETA ASFALTICA, SELLADO DE FISURAS Y OTROS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN FRANCISCO Y LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”





DENUNCIAS AMBIENTALES

APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N°
N°001-2021-MPMN, "Ordenanza Municipal que
aprueba el reglamento para la **atención de
Denuncias Ambientales** ante la entidad de
Fiscalización Ambiental (EFA), de la MPMN".

Atención a las alertas de acumulación de
Residuos Sólidos en la jurisdicción de las
Municipalidades de Torata y Samegua.

**03 DENUNCIAS
AMBIENTALES ATENDIDAS**

✓ Samegua ✓ Torata

**PLATAFORMA VIRTUAL
PARA DENUNCIAS
AMBIENTALES**

N°	PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	MEDIO DE RECEPCIÓN	ENTIDAD
01	Contaminación Sonora	Plataforma de denuncias ambientales	MPMN
02	Contaminación Sonora	Casilla Electrónica	OEFA
01	Contaminación por Residuos Sólidos	Casilla Electrónica	OEFA



DENUNCIAS AMBIENTALES

PLATAFORMA VIRTUAL

Tu Municipalidad te informa que ahora puedes realizar tu Denuncia Ambiental a Problemas Relacionados con:



Si vez un delito ambiental ¡DENÚNCIALO!



COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO


- CREADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 031-2005-MPMN
- ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2017-MPMN, ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y SU REGLAMENTO

ACUERDOS PRINCIPALES DE LAS SESIONES DE LA CAM

- Se aprueba el plan de trabajo de los grupos técnicos para abordar las prioridades de la política ambiental y climática local.

6 SESIONES DE LA CAM DESARROLLADAS EN EL 2022

ORDENANZA MUNICIPAL 016-2022-MPMN,
Ordenanza que aprueba el "Reglamento de Prevención y Control de la Calidad Ambiental en el Distrito de Moquegua"

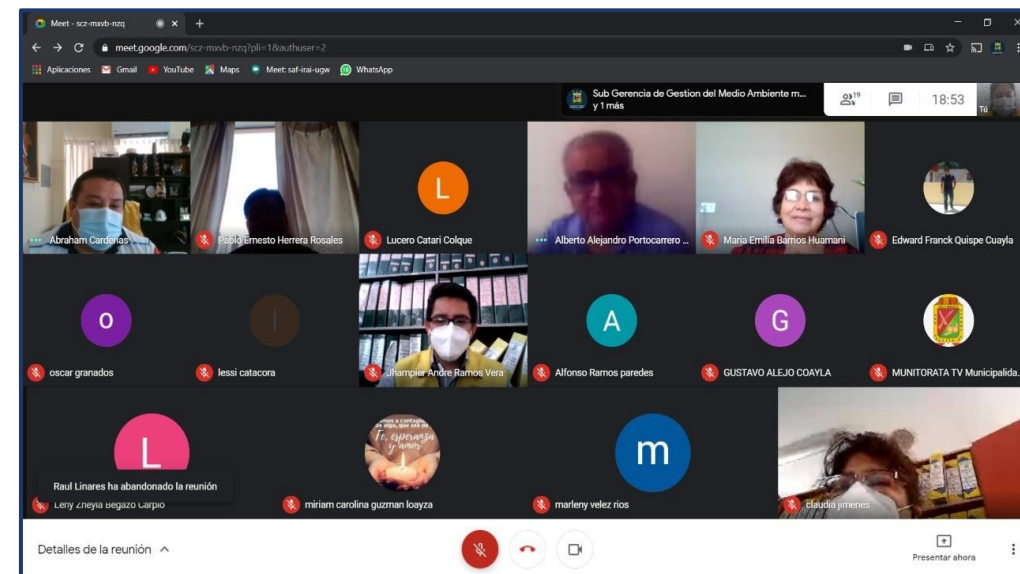

MOQUEGUA
el mejor lugar para vivir



MONITOREOS AMBIENTALES PARTICIPATIVOS

MONITOREO DE AIRE EN ZONA DE OPERACIONES

- ✓ Altarani
- ✓ Tala
- ✓ Alto Coscore
- ✓ Calientes
- ✓ Cortadera



DÉCIMA CAMPAÑA DEL MAP QUELLAVECO (Temporada seca – 2022)

MONITOREO DE AIRE EN MOQUEGUA

- ✓ San Antonio
- ✓ Moquegua
- ✓ Chen-Chen
- ✓ Ilo



Calibración de equipos para toma de
muestras en puntos de monitoreo

MONITOREO DE AGUA E HIDROBIOLOGÍA

- ✓ Zona de operaciones
- ✓ Tumilaca
- ✓ Moquegua
- ✓ Ilo



Calibración de equipos de y toma de
muestras en los diferentes puntos de
monitoreo.





PLANEFA

ORDENANZA MUNICIPAL 013-2021-MPMN,
Ordenanza que aprueba el “Reglamento de Supervisión Ambiental de la MPMN”.

ORDENANZA MUNICIPAL 016-2022-MPMN,
Ordenanza que aprueba el “Reglamento de Prevención y Control de la Calidad Ambiental en el Distrito de Moquegua”

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Proceso de Supervisión Ambiental a las **Municipalidades Distritales y Centros Poblados** respecto a las operaciones de Manejo de Residuos Sólidos dentro de la jurisdicción.

Fiscalización ambiental en materia de ruido a establecimientos comerciales (Discotecas y/o Bar) ubicados en la Calle Moquegua y zona San Bernabé

10 Supervisiones ambientales de carácter regular a obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.



- Centros Poblados supervisados**
- ✓ Los Ángeles
 - ✓ San Francisco

- Municipalidades Distritales supervisadas**
- ✓ San Antonio
 - ✓ Moquegua
 - ✓ Samegua
 - ✓ Torata
 - ✓ Carumas
 - ✓ San Cristóbal
 - ✓ Cuchumbaya





Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

¡SEGURIDAD CIUDADANA COMPROMISO DE TODOS SOLO FALTAS TU!



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***



CUADRO DE PATRULLAJES

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION								EJECUCION DE ACTIVIDADES		OBSERVACIONES	
				Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	CANTIDAD EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION		
1	Plan de Patrullaje Integrado	Acta	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0.66	66.6	NINGUNA
2	Plan de Patrullaje Municipal	acta	1080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0.66	66.6	Publicada en la web de la institución

N°	LLAMADAS ATENDIDAS								TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
1	111	147	155	241	176	71	57	42	346

¡SEGURIDAD CIUDADANA COMPROMISO DE TODOS SOLO FALTAS TU!





CUADRO INTERVENCIONES

OCURRENCIAS	PATRULLAJE								TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
PERSONAS ESTADO ETÍLICO	551	614	1010	1423	1242	960	1162	1040	8002
ROBOS	1	3	3	8	4	0	3	0	22
ROBO FRUSTRADO	1	0	3	2	0	0	1	1	8
GRESCAS	4	2	1	5	2	0	0	1	15
HURTO	0	0	2	1	2	1	0	1	7
ALTERACION AL ORDEN PUBLICO	2	20	6	6	8	0	3	4	49
INTERVENCION A MENORES DE EDAD	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AGRESION FISICA	5	5	4	3	8	1	3	1	30
VIOLENCIA FAMILIAR	4	3	1	2	1	0	0	1	12
APOYO SOCIAL	12	11	13	18	0	15	15	8	92
INCENDIOS	0	4	1	3	1	3	0	1	13
INVASORES	0	3	0	3	0	1	3	0	10
INTENTO DE ROBO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
AGRESION PSICOLOGICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
ARRESTO CIUDADANO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PELIGRO COMUN	1	0	1	0	1	1	1	0	5
LESIONES GRAVES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
INCENDIO FORESTAL	1	2	3	0	3	3	1	2	15
INVASION VIA PUBLICA	0	0	1	0	1	0	0	0	2
ACTOS CONTRA EL PATRIMONIO	0	0	0	1	0	0	1	1	3
ACCIDENTE DE TRANSITO	9	13	24	15	20	11	9	11	112
CONSUMIDORES DE DROGA	1	4	6	0	1	5	4	0	21
INTENTO DE SUICIDIO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
EXCESO DE VOLUMEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
OTROS	11	8	4	11	10	6	3	6	59





AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS

- Los agentes de Serenazgo municipal durante el servicio que desarrollan las 24 horas, se intervienen diferentes actos de infracciones que se cometen por parte de la ciudadanía así como también prestar el apoyo social a la ciudadanía.
- El personal de Serenazgo fue capacitado en el año 2022 Por Centros Especializados como: los Bomberos , Policía Nacional y Fiscalía para poder realizar una mejor intervención.
- El Patrullaje Municipal es permanente y se da en 03 turnos, cuidando la seguridad de la población las 24 horas, durante los 07 días de la semana y atendiendo las llamadas de emergencia.
- Con la implementación de cámaras de video vigilancia instaladas estratégicamente en diferentes sectores con un sistema moderno y radio de comunicación sistema tetra.
- Coordinación y ejecución de Operativos Inopinados. Con las diferentes Subgerencias y Municipalidades.





Personas libando licor en vía publica



Accidente de tránsito



Operativo en bares



Apoyo en incendios



Apoyo Social



Robos Frustrados



UNIDADES VEHICULARES Y MOTORIZADOS



¡SEGURIDAD CIUDADANA COMPROMISO DE TODOS SOLO FALTAS TU!



Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO

MUCHAS GRACIAS



MOQUEGUA
*el mejor lugar para **vivir***
